
Mapa de proceso PMO360

Ciclo de vida del proyecto, paquetes de trabajo, módulos, roles y puntos de decisión · Control integral de Proyectos · GreenLand · Versión completa · Mapa de metro

Nov. 2026 · Borrador para revisión
Los datos de la plataforma son ficticios hasta el piloto

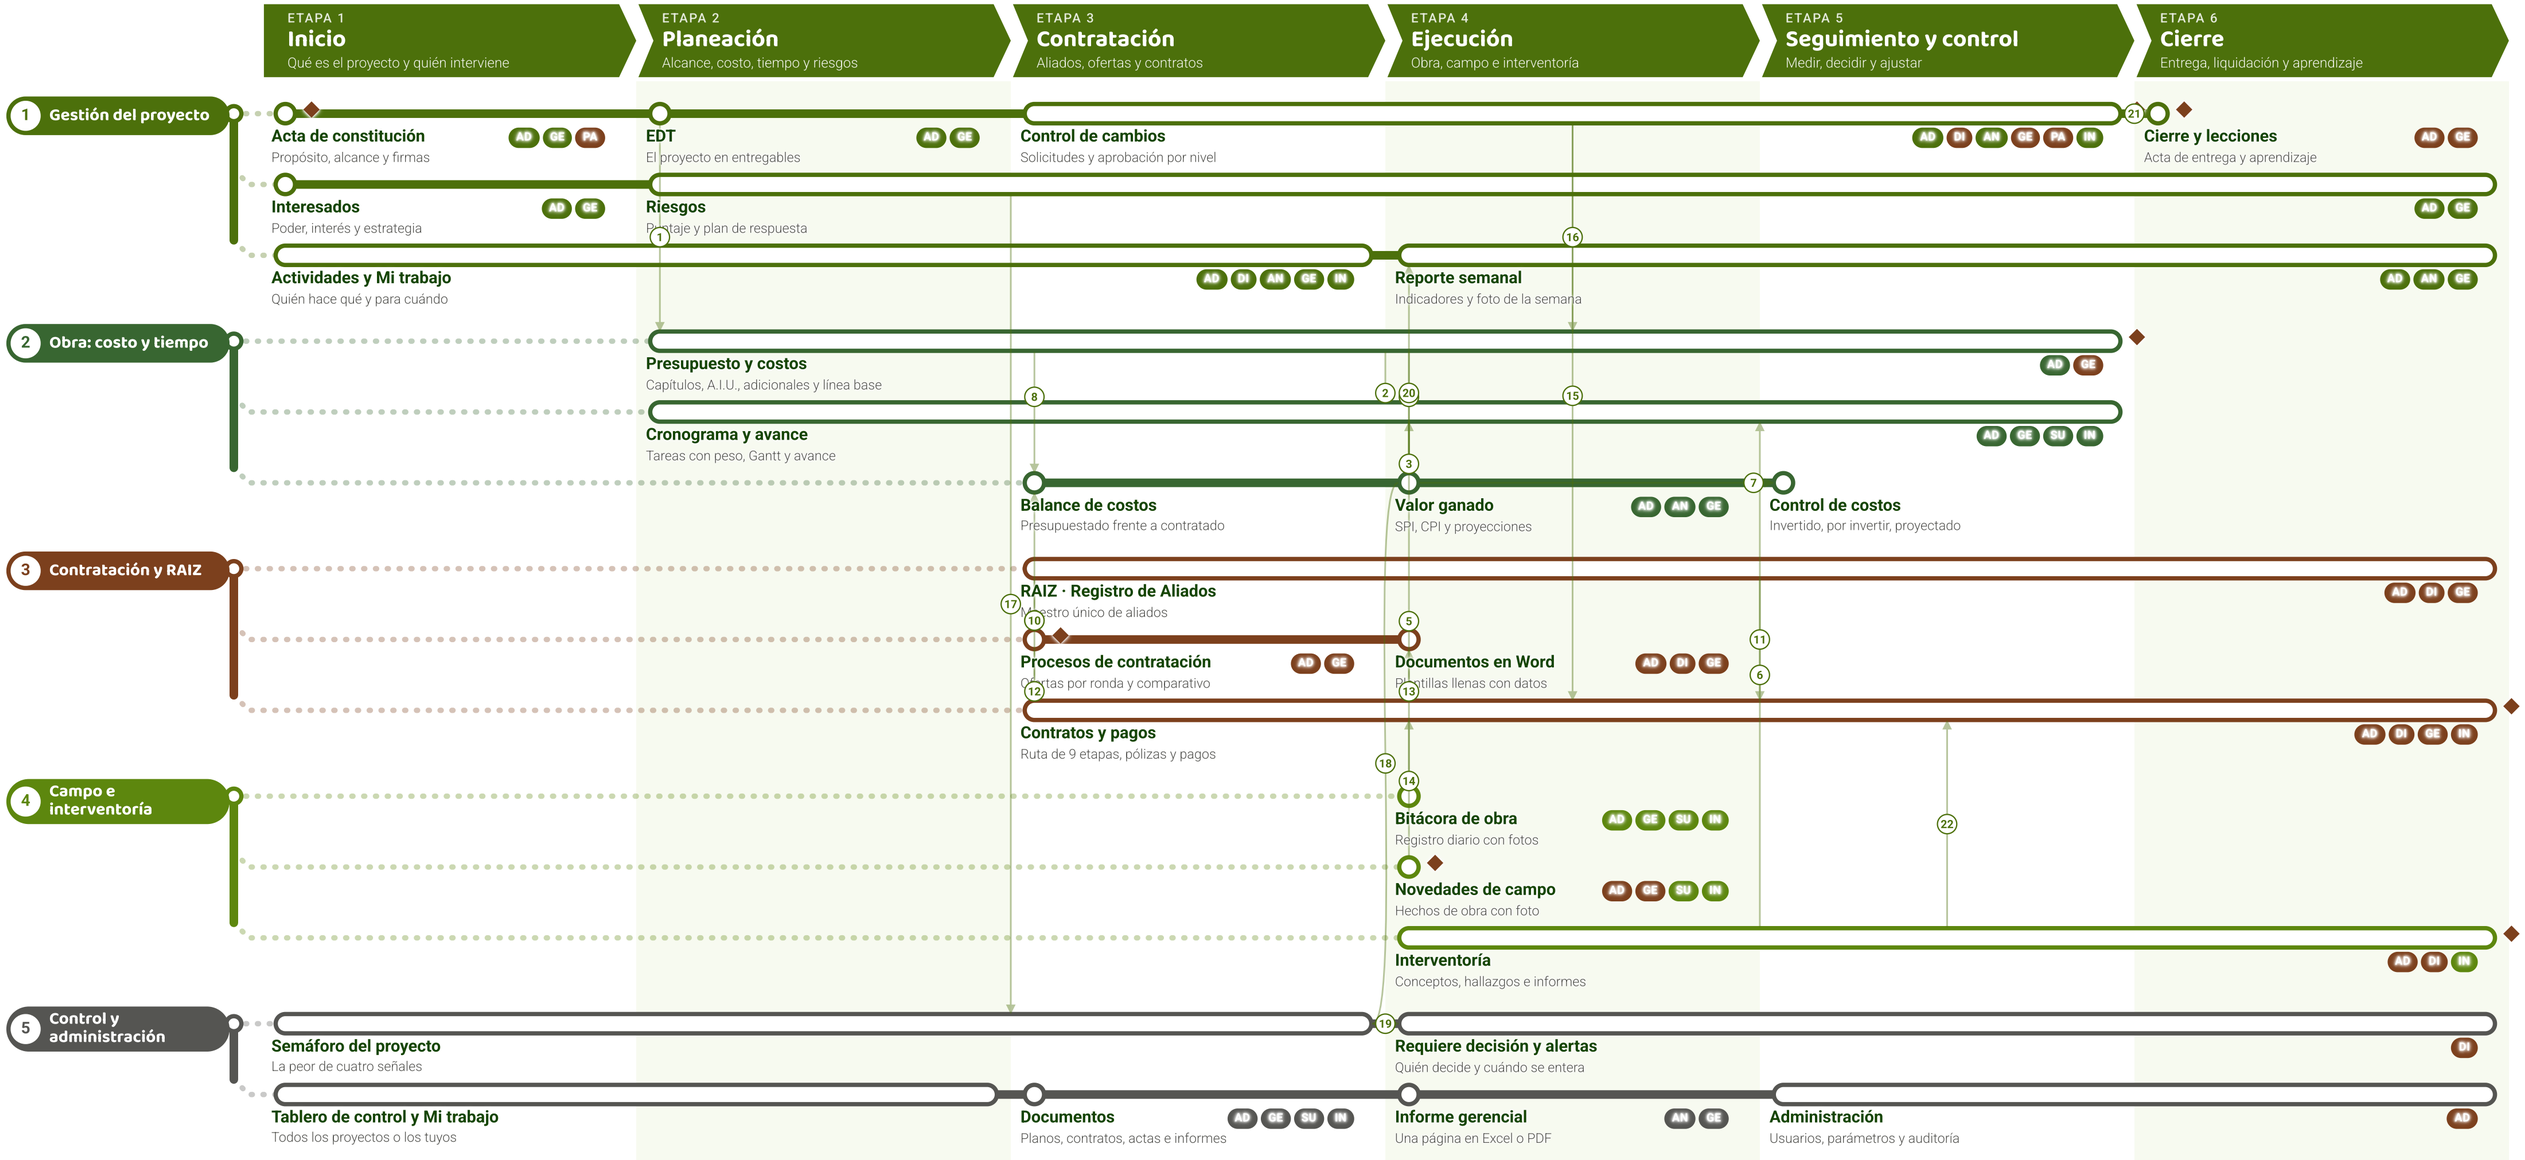

Quién puede qué

Administrador (AD)
Todo: usuarios, parámetros y estructura. Crea proyectos y asigna personas. Solo él reabre un proyecto cerrado.

Director general (DI)
Ve todo el portafolio. Aprueba los contratos nuevos y autoriza anticipos (máx. 20 %). Aprueba los cambios moderados y críticos.

Analista PMO (AN)
Ve todo el portafolio. Consolida, evalúa el impacto de los cambios y mantiene el tablero y los reportes.

Gerente de proyecto (GE)
En sus proyectos edita acta, EDT, riesgos, presupuesto, cronograma y contratos. Aprueba cambios menores, adjudica y revisa las novedades.

Patrocinador (PA)
Ve su proyecto. Firma el acta y los cambios de más de 5 % del presupuesto.

Finanzas (FI)
Ve presupuesto, contratos y pagos de todo el portafolio. Hoy solo lectura.

Supervisor de obra (SU)
Registra la bitácora con fotos y el avance de sus tareas. Ve el presupuesto.

Interventoría (IN)
Ve y conceptúa en sus contratos; verifica el avance y registra hallazgos e informes. No aprueba ni edita contratos; no ve costos.

Consulta (CO)
Solo lectura en los proyectos asignados.

Puntos de decisión ◆

- **Acta de constitución** · GE · PA: Firman el gerente y el patrocinador
- **Presupuesto y costos** · GE: Aprueba la línea base de costo
- **Control de cambios** · GE · DI · PA: Menor: gerente. Moderado y crítico: director general. Más de 5 % del presupuesto: también el patrocinador
- **Procesos de contratación** · GE: Adjudica la oferta ganadora (habilitada y con valor)
- **Contratos y pagos** · DI: Aprueba los contratos nuevos
- **Contratos y pagos** · DI: Autoriza el anticipo (máximo 20 %, con su motivo)
- **Novedades de campo** · GE · AD: Aplica o descarta cada novedad (descartar exige motivo)
- **Interventoría** · AD · DI: Asigna la interventoría a cada contrato
- **Cierre y lecciones** · GE · AD: Cierra el proyecto; los cambios sin resolver lo bloquean. Solo el administrador lo reabre

Cómo se conectan los módulos

1. EDT → Presupuesto y costos: El presupuesto se arma sobre la EDT
2. Presupuesto y costos → Cronograma y avance: Cada tarea se liga a un capítulo del presupuesto
3. Cronograma y avance → Valor ganado: Avance físico y plan alimentan el valor ganado
4. Presupuesto y costos → Valor ganado: Línea base y gasto real alimentan el valor ganado
5. Bitácora de obra → Cronograma y avance: El avance diario se suma a la tarea
6. Interventoría → Cronograma y avance: El avance verificado reemplaza al reportado
7. Valor ganado → Control de costos: Invertido y proyectado, corte a corte
8. Presupuesto y costos → Balance de costos: El presupuesto se compara con lo contratado
9. Contratos y pagos → Balance de costos: Lo contratado y facturado llega al balance
10. RAIZ · Registro de Aliados → Procesos de contratación: Los oferentes se eligen del maestro
11. RAIZ · Registro de Aliados → Contratos y pagos: El contratista se elige del maestro
12. Procesos de contratación → Contratos y pagos: La adjudicación crea el contrato
13. Contratos y pagos → Documentos en Word: Los datos del contrato llenan la plantilla
14. Novedades de campo → Contratos y pagos: Aplicar una novedad actualiza el contrato
15. Control de cambios → Contratos y pagos: Un cambio aprobado mueve el valor (otrosí)
16. Control de cambios → Presupuesto y costos: Un cambio aprobado ajusta la línea base y los adicionales
17. Riesgos → Semáforo del proyecto: Un riesgo crítico activo pone el semáforo en rojo
18. Valor ganado → Semáforo del proyecto: SPI y CPI definen el semáforo
19. Semáforo del proyecto → Requiere decisión y alertas: Las alertas llegan a quien debe decidir
20. Valor ganado → Reporte semanal: Los indicadores se congelan en el reporte semanal
21. Control de cambios → Cierre y lecciones: Los cambios sin resolver bloquean el cierre
22. Interventoría → Contratos y pagos: Conceptos sobre actas de pago y anticipo

Cómo leerlo

◆ Punto de decisión
AD Decide o aprueba
AD Registra o trabaja
1 Flecha numerada: el dato pasa de un módulo a otro
Cada módulo está en la etapa donde se usa; quien solo consulta no aparece en las siglas
