GreenLand **PMO360**
Control integral de Proyectos

Guía rápida con capturas

Para el equipo de la oficina de proyectos. Con esta guía puedes recorrer la plataforma por primera vez: por dónde entrar, qué vas a encontrar, cómo organizar tu trabajo, cómo verificar avances, cómo mirar los proyectos y dónde resolver dudas. La **segunda parte** explica el resto del módulo de Gestión (interesados, EDT, riesgos, cambios, reporte semanal, documentos y cierre) y la **tercera**, el módulo de Obra (presupuesto y costos, cronograma, contratos y pagos, y bitácora).

Cómo usar esta guía

- Cada figura es una pantalla real de la plataforma. Los **números rojos** de la imagen corresponden a la lista de debajo.
- Lo primero que ves depende de tu rol: **Tablero de control** si tu rol ve todo el portafolio; **Mi trabajo** si trabajas en uno o varios proyectos.
- Los nombres, proyectos y cifras de las capturas son **datos ficticios de ejemplo**.
- Recorrer no cambia nada: mira con confianza. Guarda con cuidado solo cuando registres información.

Contenido

- Figura 1. Ingresar a la plataforma
- Figura 2. Tu primera pantalla si tu rol ve todo el portafolio
- Figura 3. Tu primera pantalla si trabajas en proyectos: «Mi trabajo»
- Figura 4. Entrar a un proyecto
- Figura 5. Organizar el trabajo del proyecto: «Actividades»
- Figura 6. Verificar avances: «Valor ganado»
- Figura 7. Resolver dudas: «Ayuda»
- Figura 8. Gestión · Ficha y acta de constitución
- Figura 9. Gestión · Interesados
- Figura 10. Gestión · Agregar un interesado
- Figura 11. Gestión · EDT
- Figura 12. Gestión · Riesgos
- Figura 13. Gestión · Control de cambios
- Figura 14. Gestión · Un cambio y su flujo de aprobación
- Figura 15. Gestión · Registrar un cambio
- Figura 16. Gestión · Reporte semanal e indicadores
- Figura 17. Gestión · Un reporte semanal
- Figura 18. Gestión · Documentos
- Figura 19. Gestión · Un documento y sus versiones
- Figura 20. Gestión · Cierre y lecciones aprendidas
- Figura 21. Obra · Presupuesto y costos
- Figura 22. Obra · Capítulos, partidas y costos adicionales
- Figura 23. Obra · Cronograma y Gantt
- Figura 24. Obra · Contratos y pagos
- Figura 25. Obra · Detalle del contrato y evolución de pagos
- Figura 26. Obra · Bitácora: listado
- Figura 27. Obra · Bitácora: una entrada
- Figura 28. Obra · Bitácora: llenar una entrada nueva
- Figura 29. En el celular


Tu opinión importa. Después de recorrerla, cuéntame qué te quedó claro, qué te confundió y qué echaste de menos. Si algo falla, envíame una captura de pantalla con una frase: qué esperabas y qué viste.

FIGURA 1

Ingresar a la plataforma

Todos los roles

Abre la dirección de la plataforma en tu navegador (Chrome, Edge, Safari o Firefox).

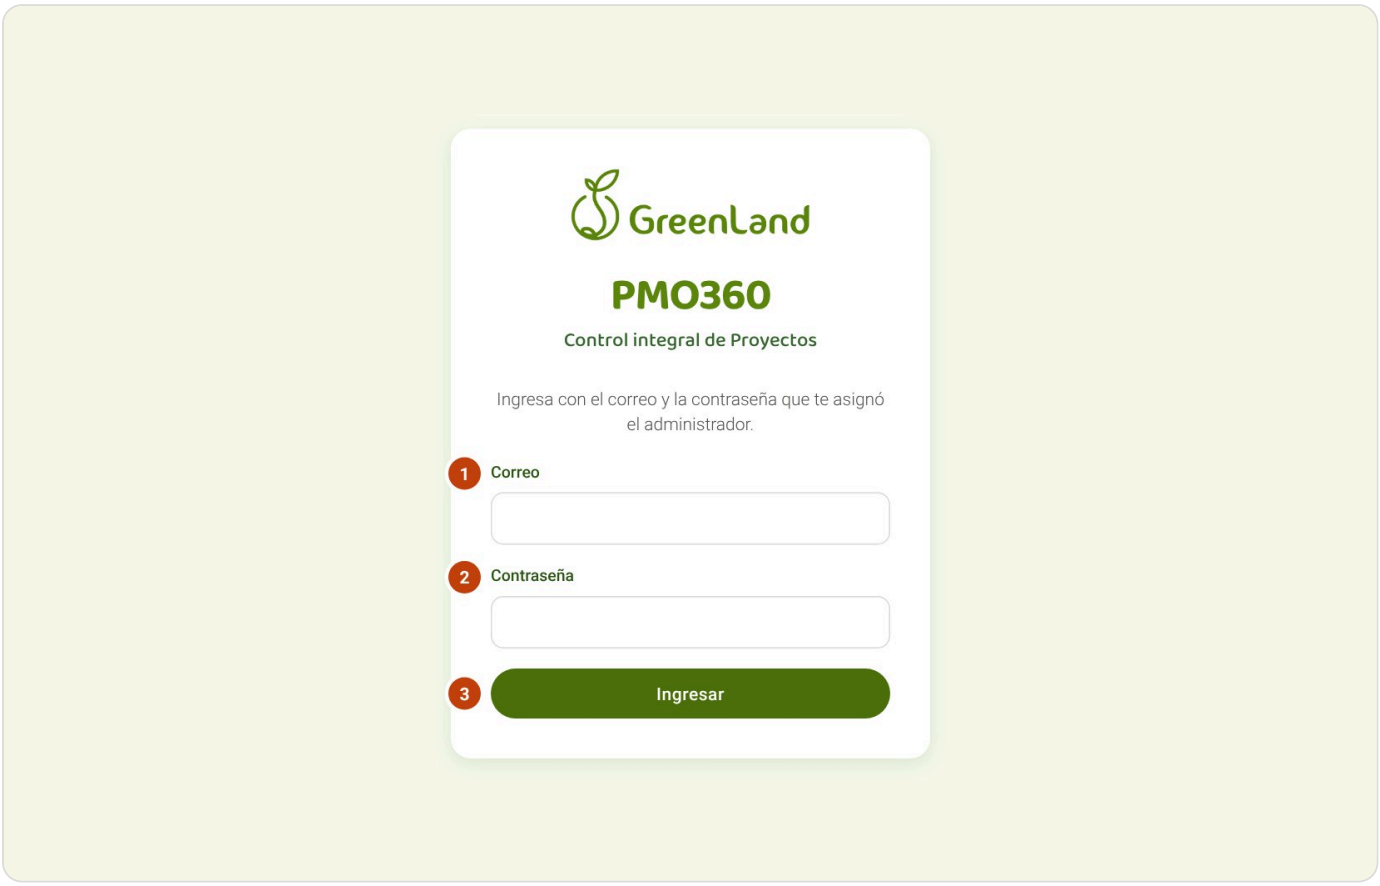

1. Escribe tu **correo** de ingreso.
2. Escribe tu **contraseña**; te llega por separado, no por este medio.
3. Pulsa **Ingresar**. Si no entras, revisa que el correo no tenga espacios y escríbeme.

FIGURA 2

Tu primera pantalla si tu rol ve todo el portafolio

Ejemplo: analista PMO

Entras al **Tablero de control**, con todos los proyectos de la plataforma.




1. **Tablero de control:** el estado de todos los proyectos en una sola vista.
2. **Mi trabajo:** tus actividades pendientes (se explica en la figura 3).
3. **Ayuda:** glosario y guías de cada módulo.
4. **Proyectos:** lista desplegable; elige uno y el menú te muestra sus módulos.
5. **Administración:** aparece según tu rol (Parámetros, Directorio de contactos y, para algunos roles, Usuarios, Organización y Auditoría).
6. **Semáforo de proyectos:** una fila por proyecto, con su estado Verde, Amarillo o Rojo, presupuesto, cronograma, costo, riesgos y cambios.
7. **Requiere decisión:** lo que está esperando atención; el enlace «Ver» te lleva al detalle.

FIGURA 3

Tu primera pantalla si trabajas en proyectos: «Mi trabajo»

Ejemplo: gerente de proyecto

Es la pantalla para saber qué te toca. Si tu rol ve todo el portafolio, la encuentras en el menú de la izquierda.

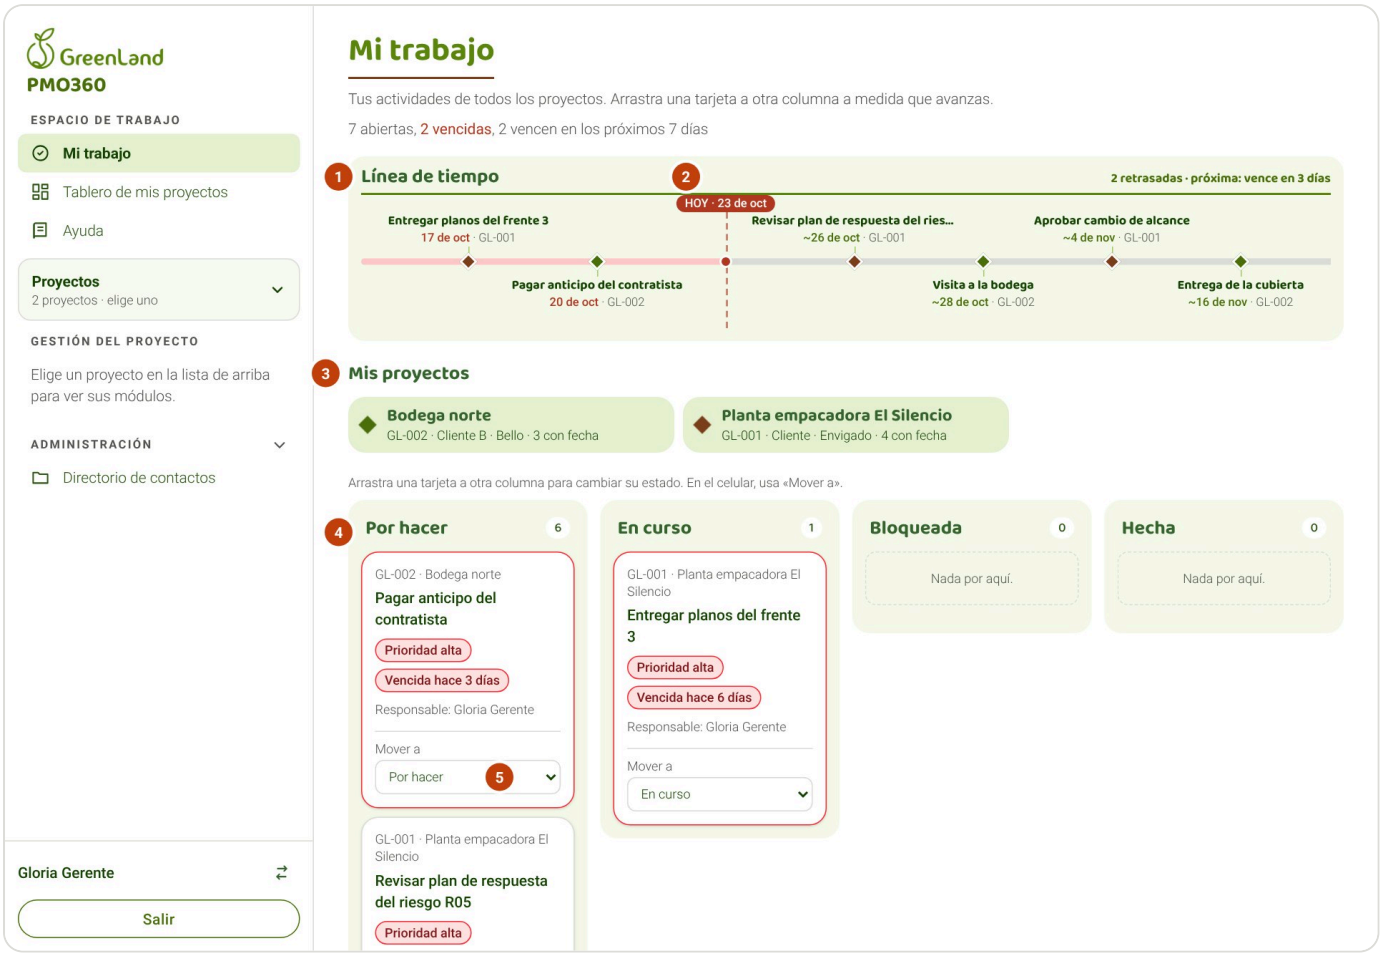

1. **Línea de tiempo:** tus pendientes con fecha, de las más atrasadas (izquierda, en rojo suave) a las futuras. Cada color es un proyecto.
2. **HOY:** la línea punteada marca el día de hoy.
3. **Mis proyectos:** tarjetas de los proyectos donde estás asignado; haz clic para entrar.
4. **Tablero de actividades:** cuatro columnas (Por hacer, En curso, Bloqueada y Hecha). Arrastra la tarjeta a otra columna cuando avances.
5. **Mover a:** alternativa a arrastrar, útil en el celular.

Pasa el cursor sobre un rótulo de la línea de tiempo para ver el nombre completo.

FIGURA 4

Entrar a un proyecto

Todos los roles con proyectos

Elige el proyecto en la lista **Proyectos** del menú, o haz clic en su tarjeta. Verás su resumen y, en el menú, los módulos que tu rol puede ver.



1. **Informe gerencial (Excel o PDF):** resumen de una página para compartir.
2. **Estado calculado:** el semáforo del proyecto. Toma la peor de cuatro señales: cronograma, costo, riesgo más alto y cambios pendientes.
3. **Avance del proyecto:** lo planeado frente a lo construido (físico, financiero y planificado).
4. **Actividades** (menú): el tablero de tareas del proyecto.
5. **Valor ganado** (menú): cómo van el cronograma y el costo.
6. **Riesgos** (menú): registro, puntaje y nivel.
7. **Control de cambios** (menú): solicitudes de cambio y su aprobación.


Si un módulo no aparece, no es un error: tu rol no lo necesita o no tiene permiso para verlo.

FIGURA 5

Organizar el trabajo del proyecto: «Actividades»

Menú del proyecto → Actividades

Tablero tipo Kanban con las actividades del proyecto y su responsable.

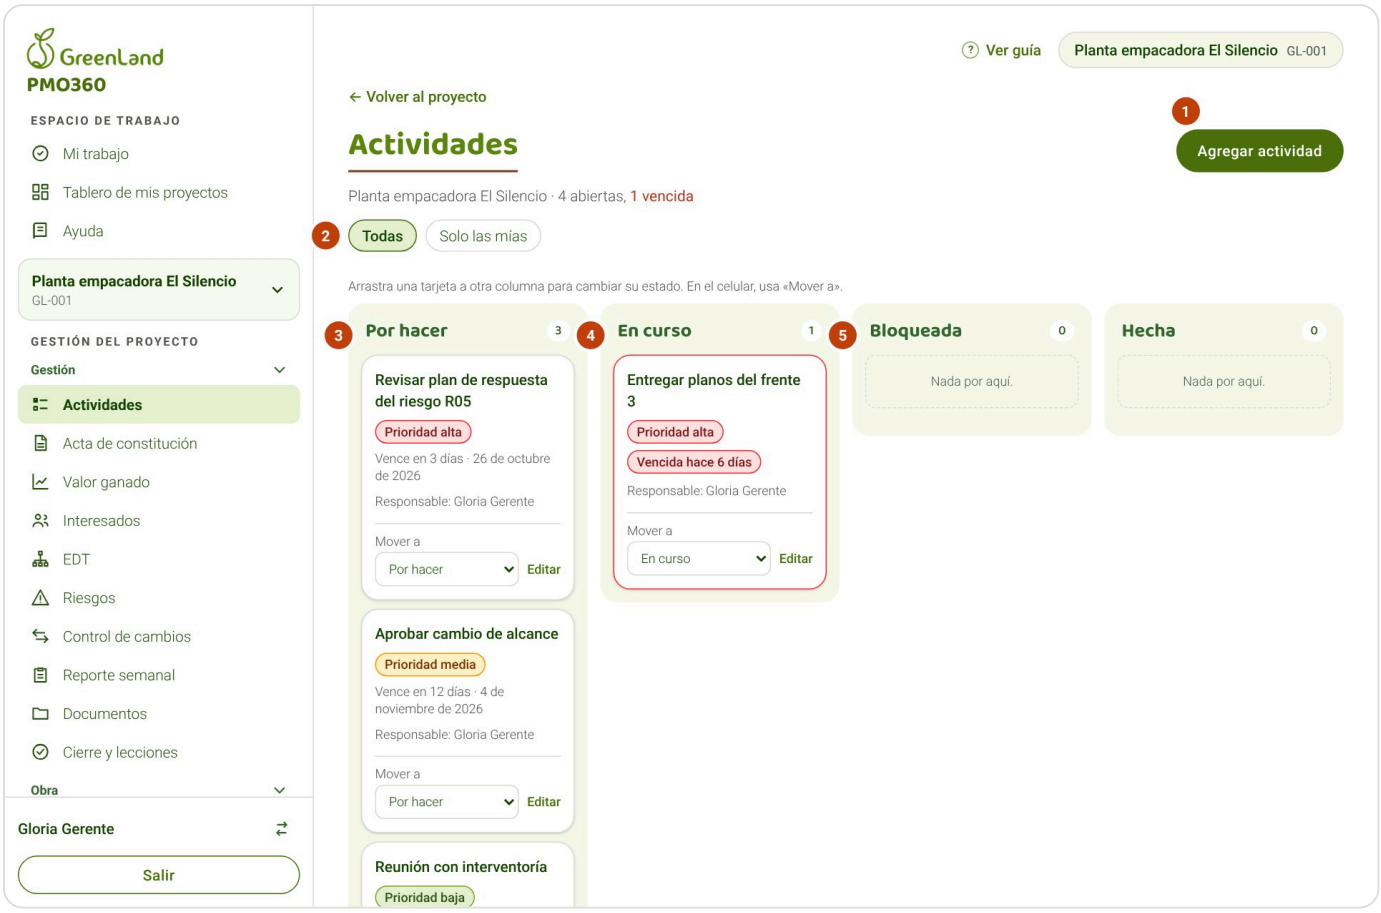

1. **Agregar actividad** (según tu rol): escribe qué hay que hacer, elige responsable y fecha límite. Es un pendiente de trabajo, no una tarea del cronograma ni una partida (ver el recuadro).
2. **Todas / Solo las mías:** filtra el tablero.
3. **Por hacer:** lo que no ha empezado.
4. **En curso:** lo que se está trabajando.
5. **Bloqueada:** lo que se trabó; pásala aquí para que el equipo lo vea.

Cada responsable mueve el estado de sus propias actividades. Una actividad queda «Vencida» si pasó su fecha límite y no está hecha.

Ojo: las actividades no son las tareas del proyecto. Son el reparto del trabajo del día a día (quién hace qué y para cuándo). **No crean ni modifican** la EDT, los capítulos del presupuesto ni las tareas del cronograma, y no mueven el avance, el valor ganado ni el semáforo. Sí puedes ligar una actividad a un riesgo o a un elemento de la EDT para saber a qué responde. Cada cosa se arma en su lugar: **entregables** → EDT · **capítulos y partidas con costo** → Presupuesto · **tareas con peso y fechas del plan** → Cronograma (su avance alimenta el valor ganado) · **quién hace qué esta semana** → Actividades.


Marcar una actividad como «Hecha» no actualiza el avance del cronograma. El avance de las tareas se registra en **Cronograma** (escribir el porcentaje y Guardar) o en la **Bitácora** (el avance del día se suma a la tarea).

FIGURA 6

Verificar avances: «Valor ganado»

Menú del proyecto → Valor ganado

Muestra cómo van el cronograma y el costo, con la última medición y su historial.

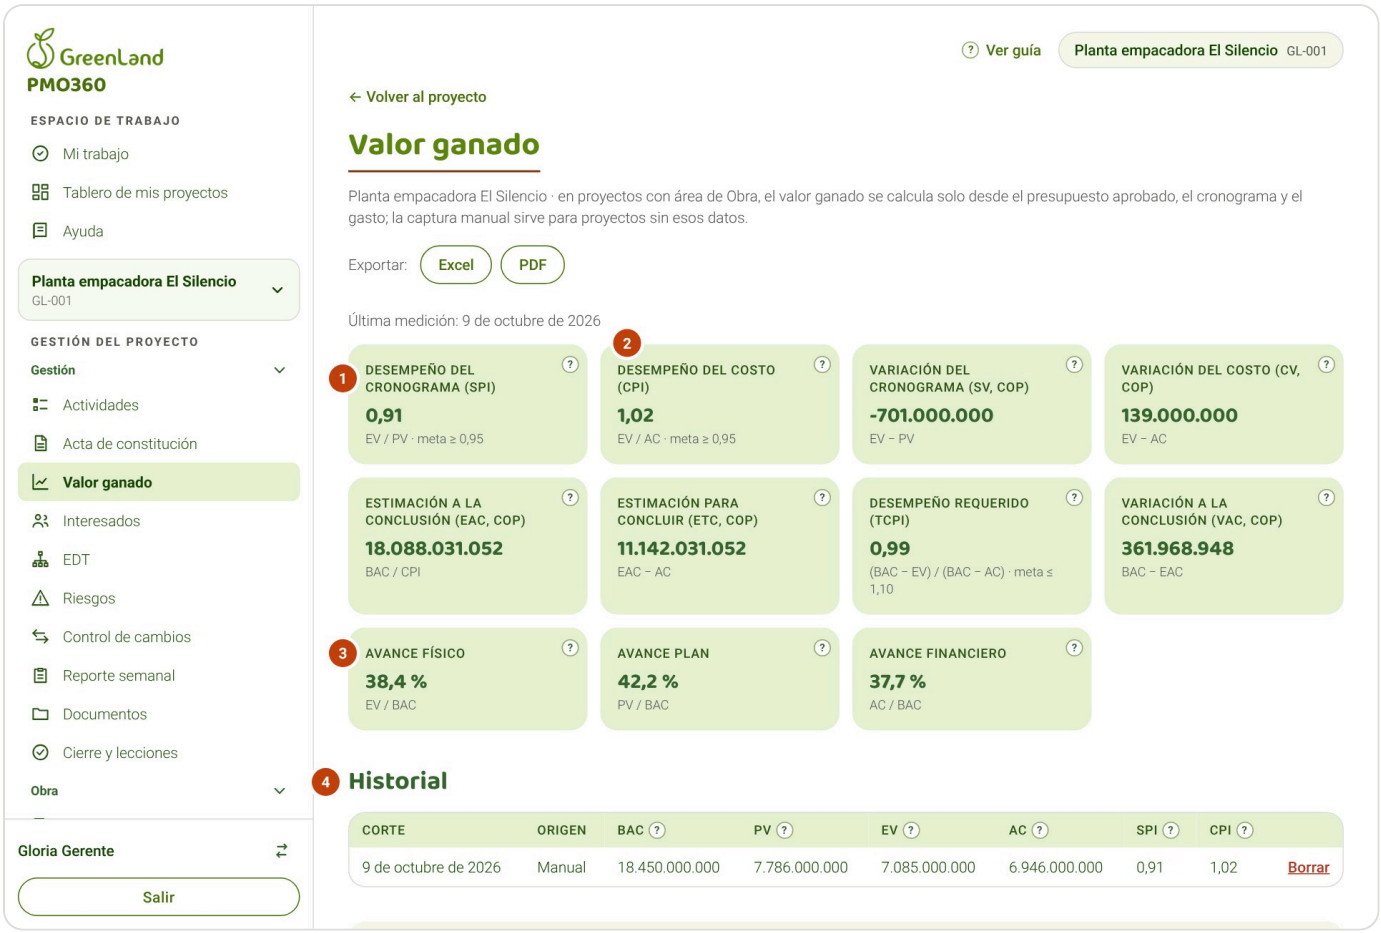

1. **Desempeño del cronograma (SPI):** 1,00 = según lo planeado; menos de 1 = atraso.
2. **Desempeño del costo (CPI):** 1,00 = según lo presupuestado; menos de 1 = sobrecosto.
3. **Avance físico, plan y financiero:** porcentajes de obra, de lo planeado y de lo gastado.
4. **Historial:** las mediciones anteriores.

El signo «?» junto a cada indicador explica qué significa.

FIGURA 7

Resolver dudas: «Ayuda»

Menú → Ayuda

Glosario y guías de cada módulo.



1. **Ayuda** en el menú de la izquierda.
2. **Glosario y guías:** busca una sigla (SPI, CPI, BAC…) o abre la guía de un módulo con sus pasos de diligenciamiento.

PARTE 2

Resto del módulo de Gestión

En la zona **Gestión del proyecto** del menú izquierdo están los módulos que sirven para planear, controlar y cerrar cualquier proyecto, tenga o no obra. Ya viste **Actividades** y **Valor ganado** en la primera parte; aquí siguen los demás, empezando por el acta. Las capturas usan un proyecto de ejemplo con datos ficticios.

Los módulos de esta parte

- **Acta de constitución:** propósito, alcance, supuestos, restricciones y firmas.
- **Interesados:** quién influye y cómo gestionarlo, con el directorio de contactos.
- **EDT:** el proyecto dividido en entregables.
- **Riesgos:** qué puede salir mal y qué hacer.
- **Control de cambios:** solicitudes de cambio, nivel y aprobación.
- **Reporte semanal:** indicadores de gestión y reportes a la dirección.
- **Documentos:** planos, contratos, actas e informes con versiones.
- **Cierre y lecciones:** acta de entrega y aprendizajes.

Cómo se conectan

- Los **riesgos** críticos y los **cambios** críticos pendientes ponen el semáforo del proyecto en rojo.
- Un **cambio** aprobado ajusta la línea base de costo o de cronograma y puede ligarse a un riesgo o a un contrato.
- El **reporte semanal** guarda una foto de los indicadores del proyecto cuando se envía.
- El **cierre** exige resolver los cambios pendientes y registrar lecciones aprendidas.

Quién hace qué (según el rol)

- **Gerente del proyecto:** interesados, EDT, riesgos, cambios, reportes, documentos y cierre.
- **Director general:** aprueba cambios moderados y críticos.
- **Patrocinador:** firma los cambios de más del 5 % del presupuesto.
- **Interventoría:** ve solo los documentos marcados como visibles y emite concepto en los cambios ligados a sus contratos.


Tip: si un módulo no aparece en tu menú, tu rol no lo necesita o no tiene permiso.

FIGURA 8

Gestión · Ficha y acta de constitución

Menú del proyecto → Gestión → Acta de constitución

El punto de partida del proyecto: sus datos generales, el acta y las firmas. La diligencia el gerente del proyecto o el administrador. (Datos ficticios.)

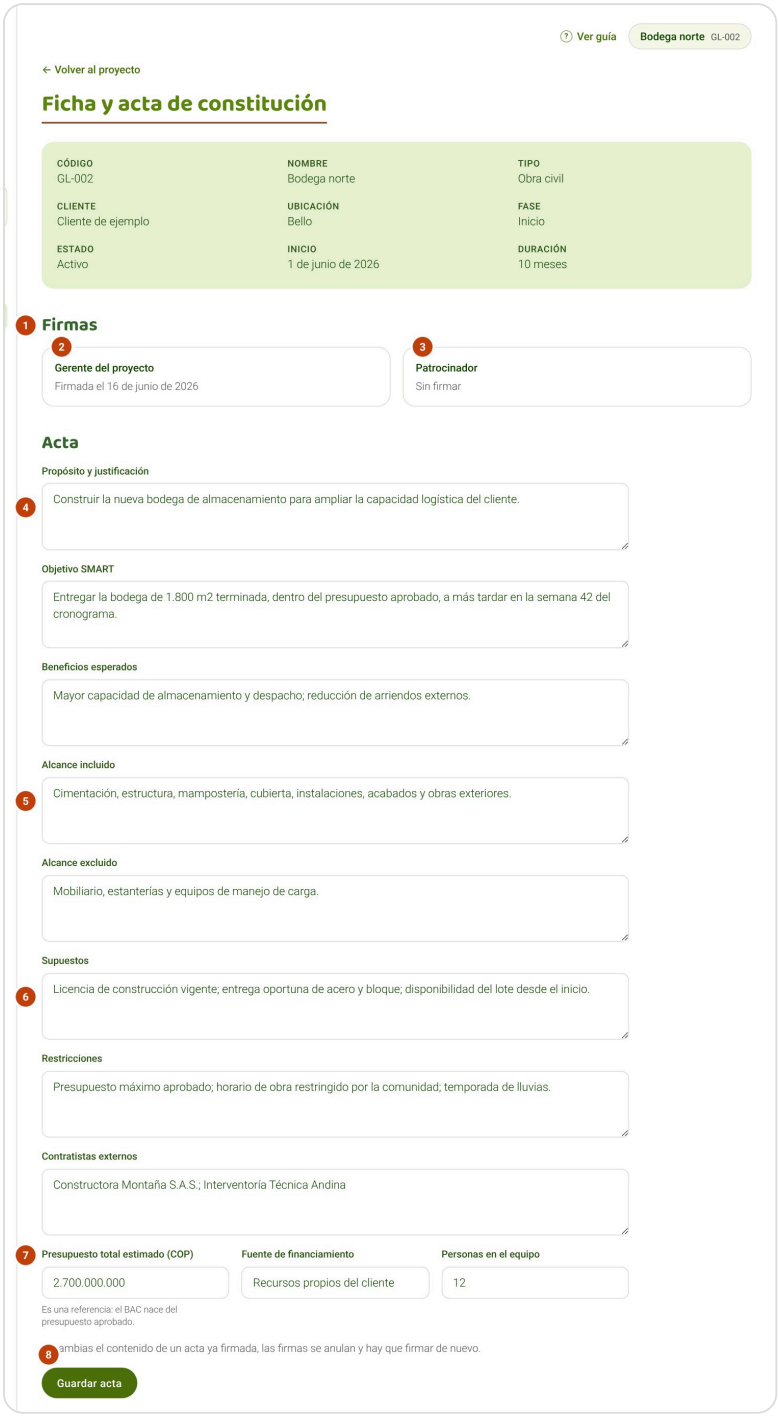

1. **Firmas:** hay dos, la del gerente y la del patrocinador. Cada una guarda la fecha; el botón «Firmar» lo ve quien tiene ese rol y el acta debe estar guardada.
2. **Gerente del proyecto:** aquí ya firmó (con su fecha).
3. **Patrocinador:** aquí aún «Sin firmar»; la firma el patrocinador.
4. **Propósito y justificación,** objetivo SMART (específico, medible, alcanzable, relevante y con plazo) y beneficios esperados.
5. **Alcance incluido y excluido:** qué entra y qué no entra en el proyecto.
6. **Supuestos y restricciones:** lo que se da por cierto y lo que limita el proyecto.
7. **Presupuesto total estimado:** es una referencia; el presupuesto que vale (BAC) nace del presupuesto aprobado en el módulo Presupuesto.
8. **Guardar acta:** si cambias el contenido de un acta ya firmada, las firmas se anulan y hay que firmar de nuevo.


Arriba del acta está la ficha del proyecto (código, cliente, ubicación, fase, estado, inicio y duración); se edita con «Editar proyecto» en la página del proyecto.

FIGURA 9

Gestión · Interesados

Menú del proyecto → Gestión → Interesados

Quiénes participan o influyen en el proyecto y cómo gestionarlos. (Datos ficticios.)

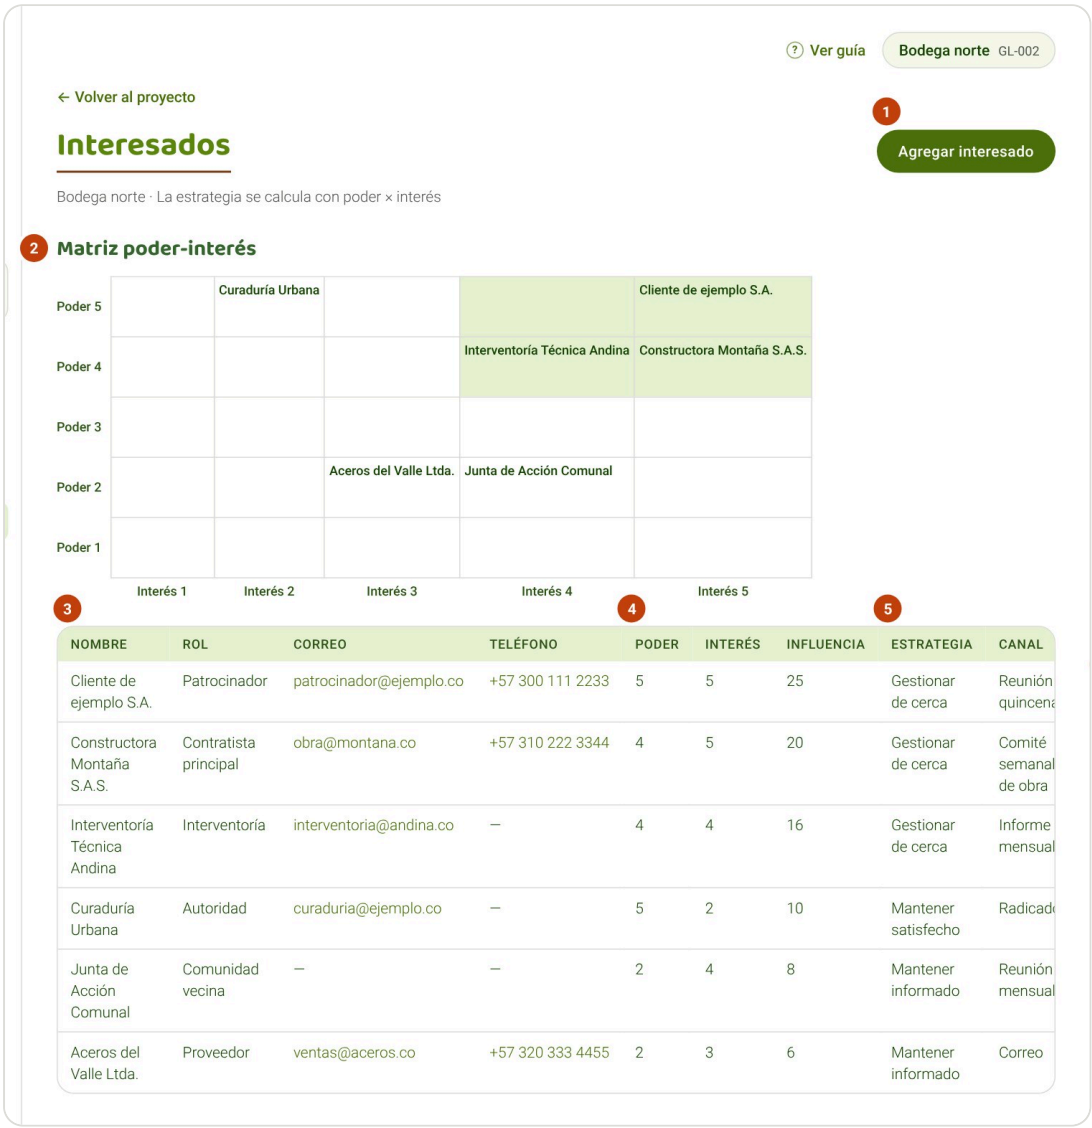

1. **Agregar interesado:** abre el formulario (figura siguiente).
2. **Matriz poder-interés:** ubica a cada persona u organización según su poder (filas, 1 a 5) y su interés (columnas, 1 a 5).
3. **Nombre, rol, correo y teléfono:** los datos de contacto de cada interesado.
4. **Poder e interés (1 a 5):** cuánto puede influir y cuánto le importa el proyecto. La **influencia** es poder × interés.
5. **Estrategia:** la calcula la plataforma según poder e interés (por ejemplo, «Gestionar de cerca», «Mantener satisfecho» o «Mantener informado»).
6. **Editar:** corrige los datos de un interesado.


Cada interesado tiene un canal de comunicación y sus necesidades; así sabes cómo y con qué frecuencia contactarlo.

FIGURA 10

Gestión · Agregar un interesado

Interesados → Agregar interesado

Formulario con el directorio de contactos para no volver a escribir los datos de una persona en cada proyecto.

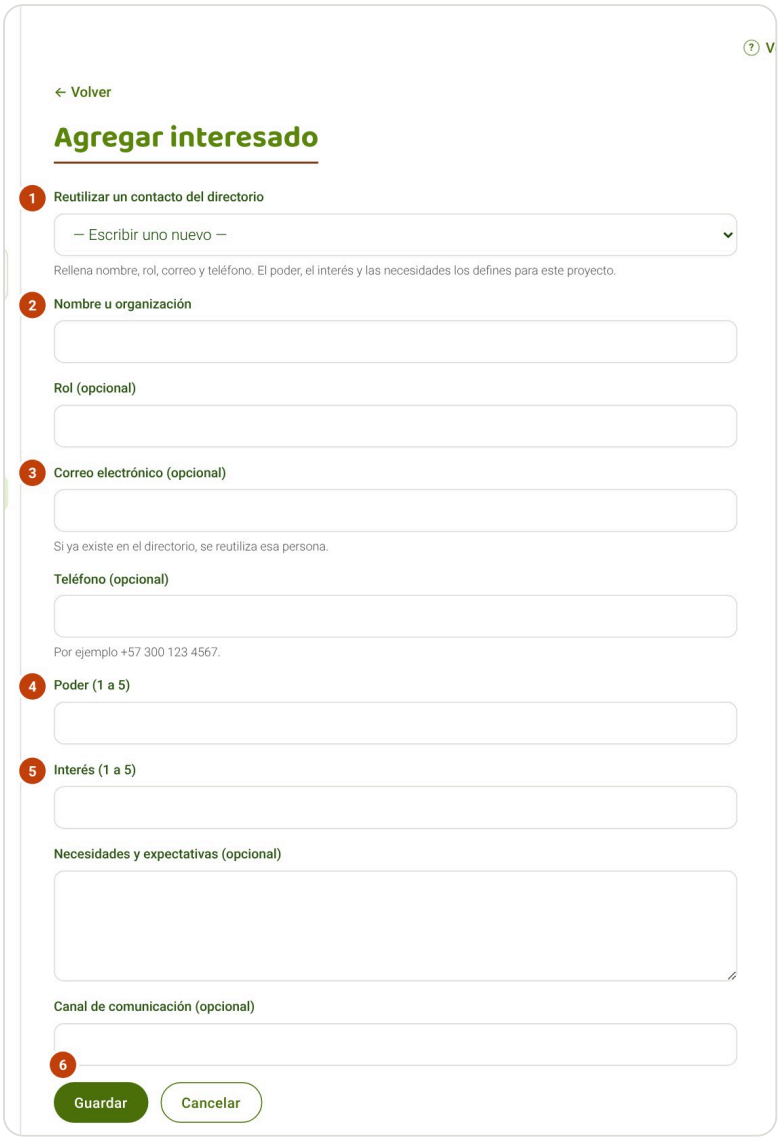

1. **Reutilizar un contacto del directorio:** rellena nombre, rol, correo y teléfono. El poder, el interés y las necesidades los defines para este proyecto.
2. **Nombre u organización.**
3. **Correo electrónico:** si ya existe en el directorio, se reutiliza esa persona.
4. **Poder (1 a 5).**
5. **Interés (1 a 5).**
6. **Guardar:** la persona queda en el directorio de contactos para usarla en otros proyectos.

El directorio de contactos está en el menú, zona Administración, según tu rol.

FIGURA 11

Gestión · EDT

Menú del proyecto → Gestión → EDT

Estructura de desglose del trabajo: el proyecto dividido en entregables, de lo general a lo particular.



1. **Agregar elemento:** crea un entregable (puede colgar de otro).
2. **Código:** 1, 1.1, 1.2.1… cada punto es un nivel más de detalle.
3. **Entregable:** el nombre; la sangría muestra su nivel.
4. **Responsable:** quién responde por ese entregable.
5. **Estado:** Pendiente, En curso o Completado.
6. **Costo directo:** se llena cuando el presupuesto se arma sobre la EDT (menú Presupuesto → «Crear capítulos desde la EDT»).


Recomendación: arma primero la EDT; después el presupuesto y el cronograma se ligan a ella.

FIGURA 12

Gestión · Riesgos

Menú del proyecto → Gestión → Riesgos

Registro de riesgos con su puntaje, nivel y plan de acción. Puntaje = probabilidad × impacto: Crítico 15–25, Alto 8–14, Medio 4–7, Bajo 1–3.

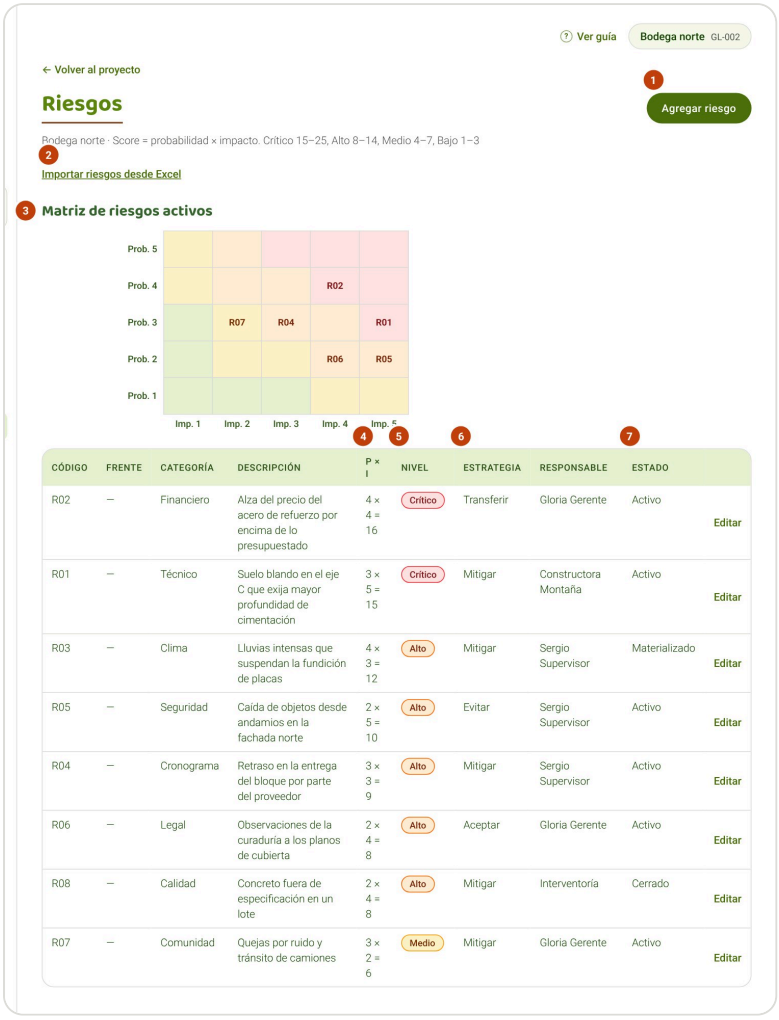

1. **Agregar riesgo:** descripción, categoría, probabilidad e impacto (1 a 5), estrategia, plan de acción y responsable.
2. **Importar riesgos desde Excel:** carga un registro existente; revisa la vista previa y confirma.
3. **Matriz de riesgos activos:** cada código (R01, R02…) en su casilla de probabilidad e impacto; el color indica la severidad.
4. **P × I:** el puntaje del riesgo.
5. **Nivel:** Crítico, Alto, Medio o Bajo, calculado por la plataforma.
6. **Estrategia:** evitar, mitigar, transferir o aceptar.
7. **Estado:** activo, materializado o cerrado.

Un riesgo crítico activo pone el proyecto en rojo en el semáforo.

FIGURA 13

Gestión · Control de cambios

Menú del proyecto → Gestión → Control de cambios

Todas las solicitudes de cambio del proyecto y en qué fase van.



1. **Registrar cambio:** abre el formulario (figura 15).
2. **Excel / PDF:** exporta la lista.
3. **Nivel:** Menor, Moderado o Crítico; lo calcula la plataforma según el impacto en costo frente al presupuesto (BAC) o al valor del contrato.
4. **Estado:** la fase del flujo en que está el cambio.
5. **Código (CC-2026-001…):** haz clic para abrir el cambio.


Un cambio crítico pendiente pone el proyecto en rojo.

FIGURA 14

Gestión · Un cambio y su flujo de aprobación

Control de cambios → clic en un cambio

El detalle de un cambio: qué cambia, cuánto cuesta y quién decide.

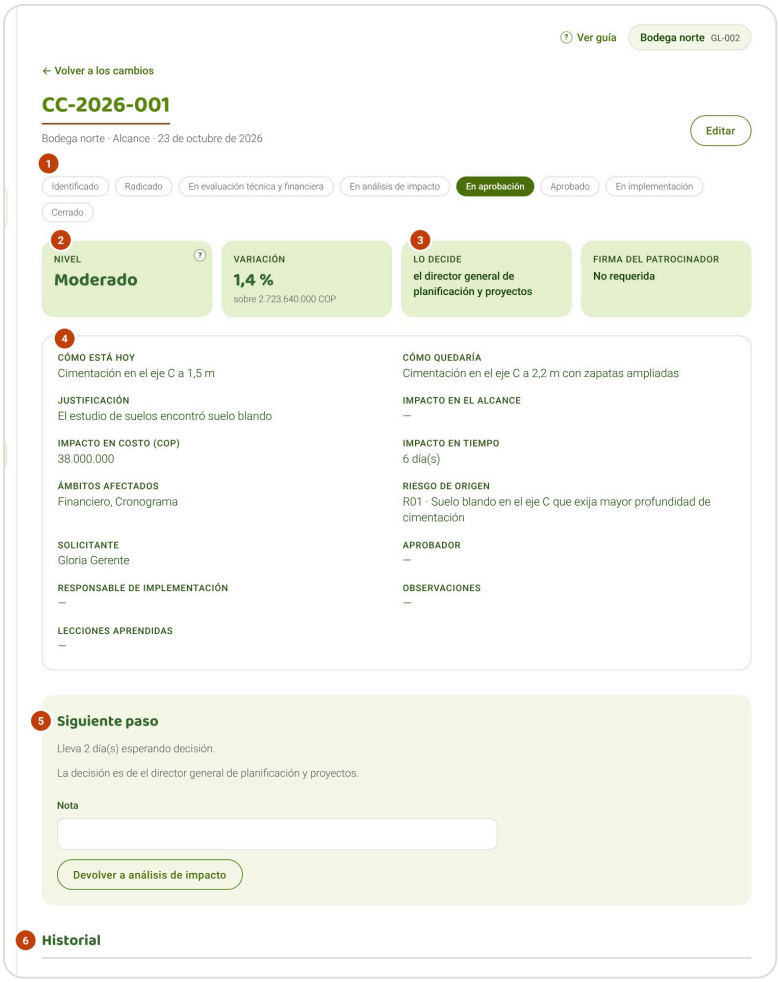

1. **Fases:** Identificado → Radicado → En evaluación técnica y financiera → En análisis de impacto → En aprobación → Aprobado → En implementación → Cerrado. La actual aparece resaltada.
2. **Nivel y variación:** aquí «Moderado», 1,4 % sobre el presupuesto.
3. **Lo decide:** quien aprueba según el nivel (el gerente, los menores; el director general, los moderados y críticos). Si supera el 5 % también firma el patrocinador.
4. **Cómo está hoy / cómo quedaría:** la descripción del cambio, su justificación, impacto en costo y tiempo, ámbitos y riesgo de origen.
5. **Siguiente paso:** avanzar el cambio a la siguiente fase o devolverlo con una nota; quien decide lo aprueba o lo rechaza.
6. **Historial:** quién movió el cambio y cuándo.


Al aprobarse, el presupuesto o el cronograma se ajustan con una nueva versión de la línea base.

FIGURA 15

Gestión · Registrar un cambio

Control de cambios → Registrar cambio

Formulario de solicitud de cambio. El nivel no se elige: lo calcula la plataforma.

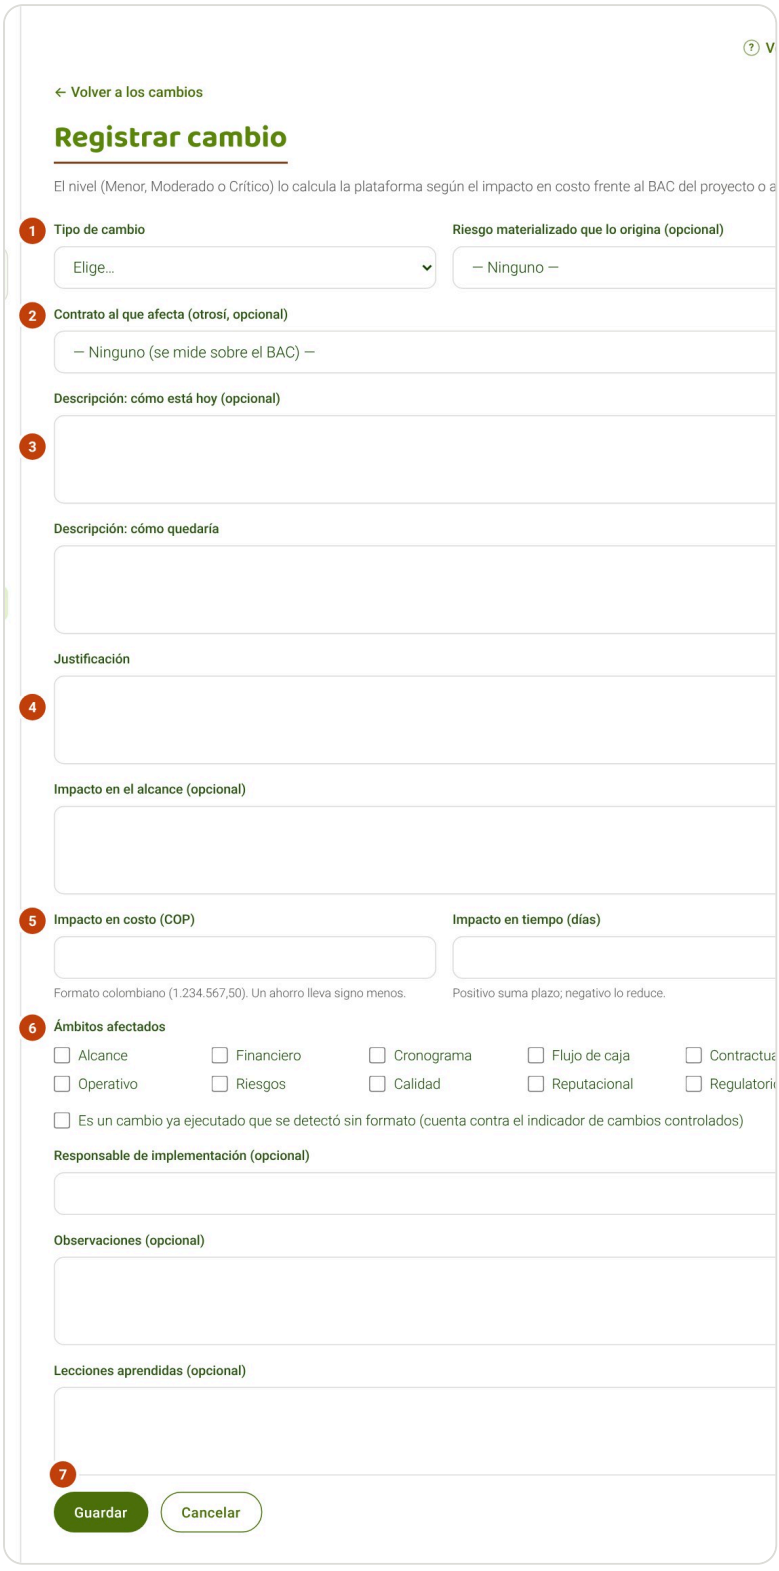

1. **Tipo de cambio** (y, si lo hay, el riesgo materializado que lo origina).
2. **Contrato al que afecta (opcional):** si lo eliges, el nivel se mide sobre el valor de ese contrato; si no, sobre el presupuesto.
3. **Cómo está hoy y cómo quedaría:** descripción antes y después.
4. **Justificación:** por qué se necesita.
5. **Impacto en costo y en tiempo:** costo en pesos (formato 1.234.567,50; un ahorro lleva signo menos) y días (positivo suma plazo; negativo lo reduce).
6. **Ámbitos afectados:** alcance, financiero, cronograma, contractual, riesgos…
7. **Guardar:** crea el cambio en la fase «Identificado».


Quien debe decidir recibe un aviso por correo cuando el cambio llega a «En aprobación» (cuando el envío de correos esté configurado).

FIGURA 16

Gestión · Reporte semanal e indicadores

Menú del proyecto → Gestión → Reporte semanal

Los indicadores de gestión del proyecto y los reportes semanales enviados.

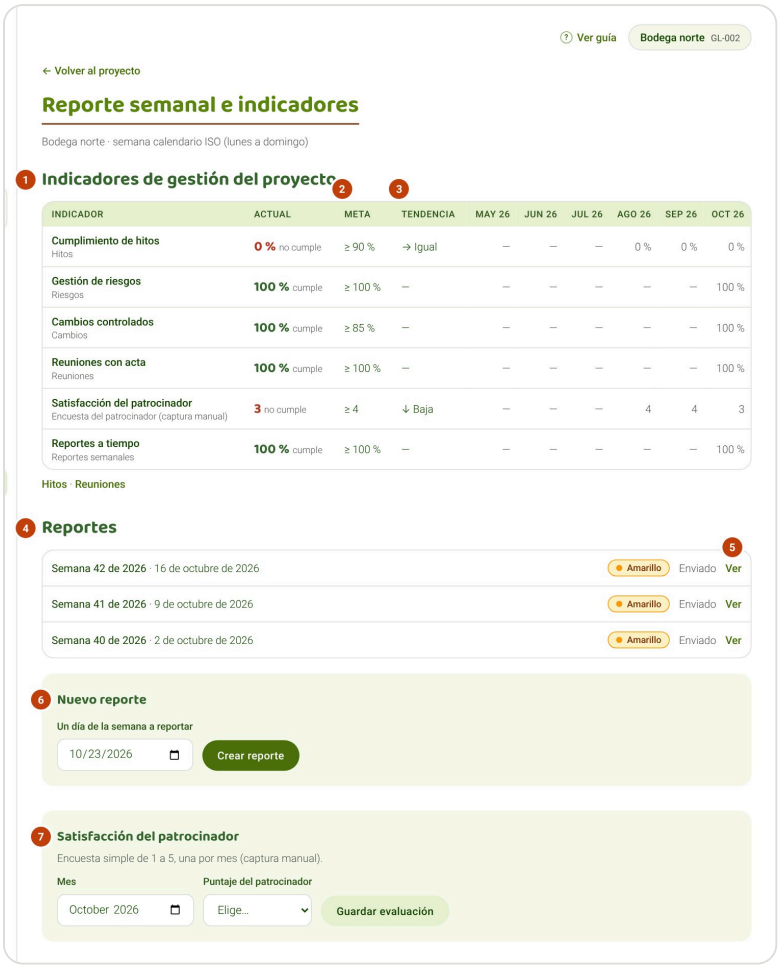

1. **Indicadores de gestión:** cumplimiento de hitos, gestión de riesgos, cambios controlados, reuniones con acta, satisfacción del patrocinador y reportes a tiempo.
2. **Meta:** el valor esperado; «cumple» o «no cumple» según el actual.
3. **Tendencia:** la dirección y los últimos meses.
4. **Reportes:** uno por semana, con el estado que declara el gerente (Verde, Amarillo o Rojo).
5. **Ver:** abre el reporte enviado.
6. **Nuevo reporte:** elige un día de la semana a reportar y pulsa «Crear reporte»; luego completa logros, alertas, decisiones requeridas y próximos hitos, y envíalo.
7. **Satisfacción del patrocinador:** puntaje de 1 a 5, una vez por mes.

Debajo de la tabla de indicadores están los enlaces «Hitos» y «Reuniones», para registrar los hitos del proyecto y las reuniones con acta.

FIGURA 17

Gestión · Un reporte semanal

Reporte semanal → Ver

El reporte enviado de una semana, con los indicadores tal como estaban al enviarlo.



1. **Semana y estado reportado:** el que declaró el gerente (aquí, Amarillo).
2. **Excel y PDF:** descarga el reporte.
3. **Indicadores al enviar:** SPI, CPI, avances y hitos cumplidos; son una foto histórica y no se recalculan.
4. **Logros de la semana** y alertas y riesgos activos.
5. **Decisiones requeridas de la dirección:** lo que necesitas que decida la dirección.
6. **Próxima revisión** y próximos hitos.


Si el estado reportado difiere del semáforo calculado, la plataforma lo marca.

FIGURA 18

Gestión · Documentos

Menú del proyecto → Gestión → Documentos

Planos, contratos, actas e informes del proyecto, con versiones.

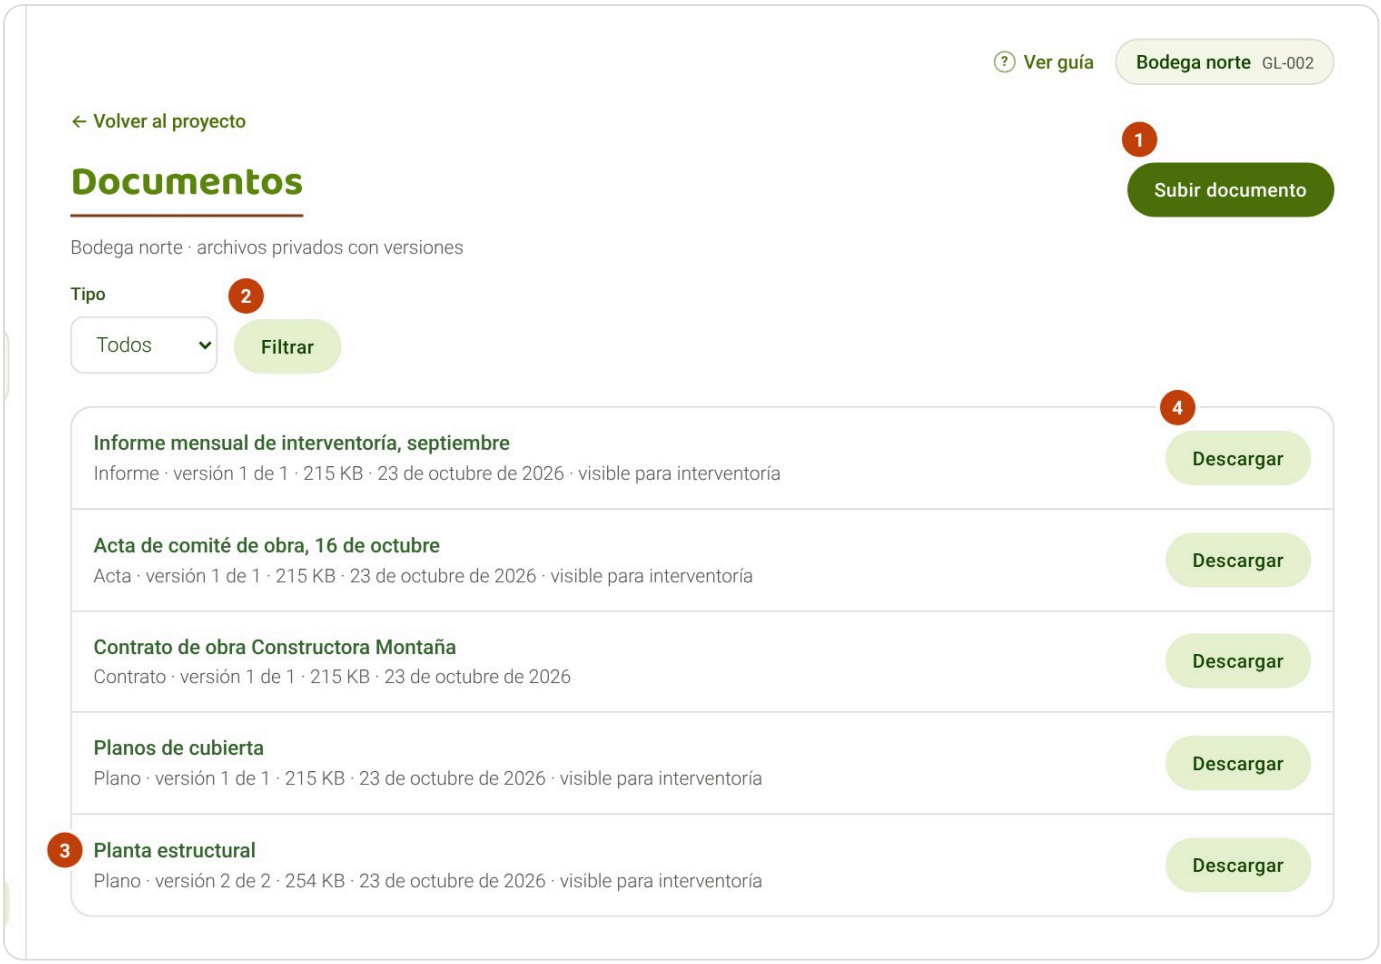

1. **Subir documento:** elige el tipo (plano, contrato, acta, informe u otro), el nombre y el archivo.
2. **Filtrar:** por tipo de documento.
3. **Cada documento:** tipo, versión, tamaño, fecha, quién lo subió y si es visible para la interventoría.
4. **Descargar:** baja la última versión.


Haz clic en el nombre de un documento para ver todas sus versiones.

FIGURA 19

Gestión · Un documento y sus versiones

Documentos → clic en un documento

Todas las versiones de un documento se conservan.

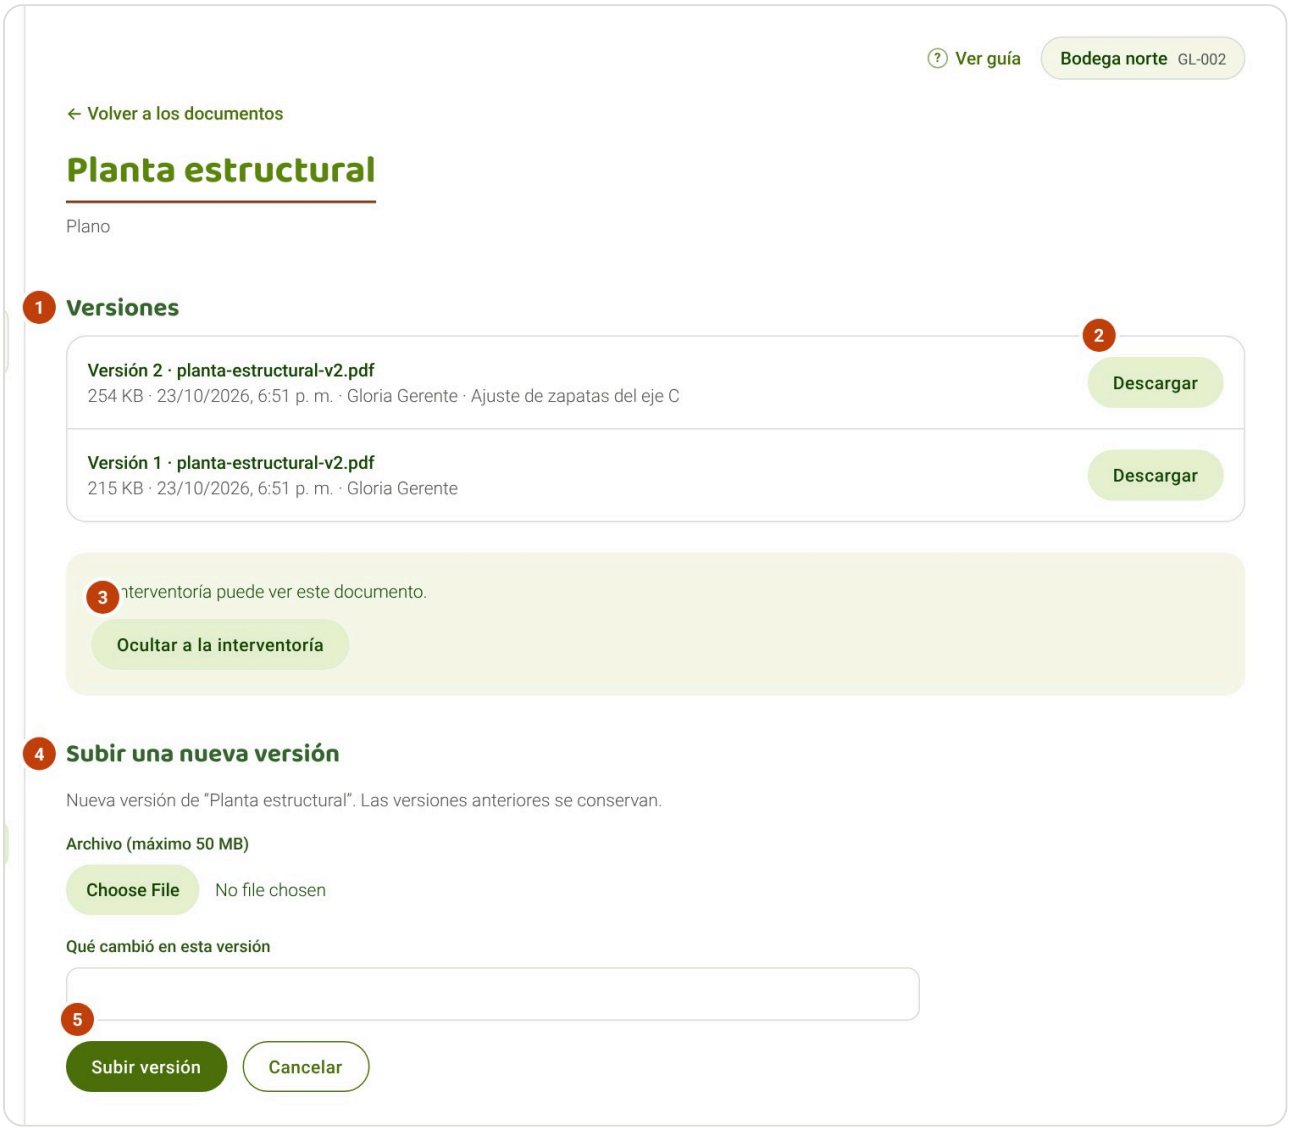


1. **Versiones:** la lista, con tamaño, fecha, quién la subió y qué cambió.
2. **Descargar:** cada versión por separado.
3. **Visibilidad para la interventoría:** la interventoría solo ve los documentos que marques como visibles; el botón la oculta o la muestra.
4. **Subir una nueva versión:** archivo (máximo 50 MB) y una nota de qué cambió. Las versiones anteriores se conservan.
5. **Subir versión:** guarda la nueva versión.

FIGURA 20

Gestión · Cierre y lecciones aprendidas

Menú del proyecto → Gestión → Cierre y lecciones

Acta de entrega y cierre del proyecto, y el registro de lecciones aprendidas.

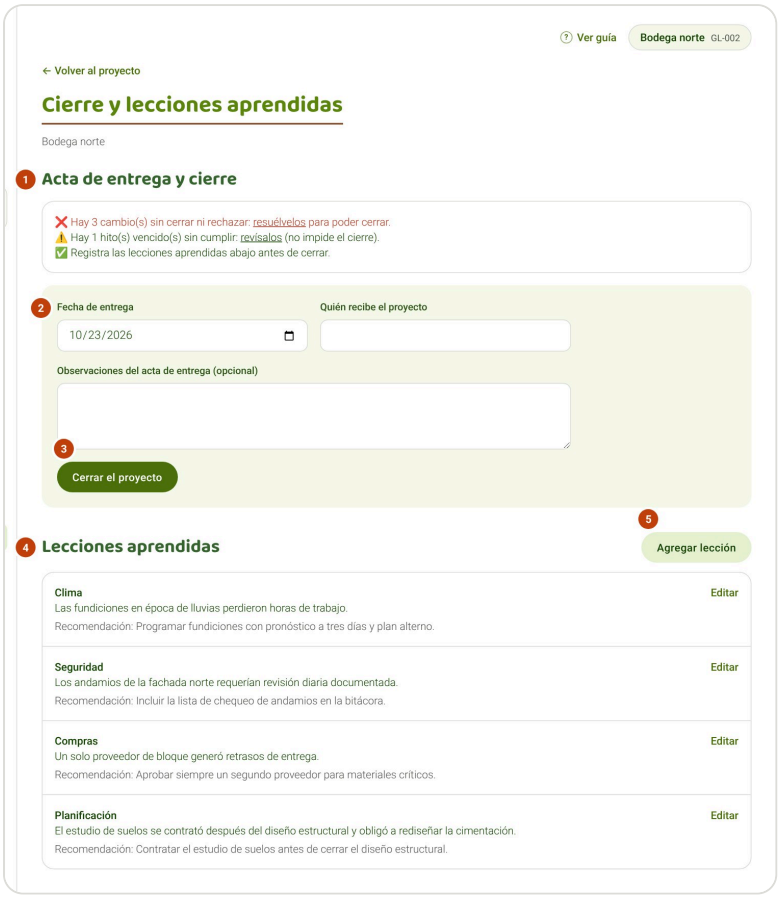

1. **Acta de entrega y cierre:** la lista de condiciones. Los cambios sin cerrar ni rechazar bloquean el cierre; los hitos vencidos avisan pero no lo impiden; hay que registrar lecciones aprendidas antes de cerrar.
2. **Fecha de entrega y quién recibe el proyecto** (más observaciones opcionales).
3. **Cerrar el proyecto:** registra el cierre.
4. **Lecciones aprendidas:** categoría, qué pasó y recomendación para próximos proyectos.
5. **Agregar lección:** registra una nueva lección; «Editar» corrige una existente.

No cierres un proyecto de prueba: el cierre cambia su estado. En esta guía el proyecto de ejemplo no se cerró.

PARTE 3

Módulo de Obra

Si tu proyecto tiene **área de Obra**, en el menú del proyecto aparece una zona **Obra** con cuatro pantallas. Sirven para llevar el costo, el cronograma, los contratos y el día a día de la construcción. Las figuras siguientes usan un proyecto de ejemplo con datos ficticios.

Las cuatro pantallas de Obra

- **Presupuesto:** capítulos, partidas, costos adicionales, gasto real y Curva S.
- **Cronograma:** tareas, pesos, avance y Gantt.
- **Contratos y pagos:** contratos, anticipo, actas de pago y retención.
- **Bitácora:** registro diario con clima, personal, actividades, retrasos e incidentes.

Orden recomendado para llenarlas

1. Presupuesto: partidas y costos adicionales; luego aprobar la línea base.
2. Cronograma: tareas con su peso (suma 100 %).
3. Contratos: registrar cada contrato y radicar sus actas.
4. Bitácora: una entrada por día; el avance diario alimenta el cronograma.

Quién hace qué (según el rol)

- **Gerente del proyecto:** presupuesto, cronograma, contratos y actas.
- **Supervisor de obra:** avance de las tareas y entradas de bitácora.
- **Interventoría:** avance verificado, conceptos sobre las actas y comentarios en la bitácora.
- **Director general:** autoriza el anticipo de los contratos.


Con presupuesto aprobado, cronograma y gasto, el **valor ganado se calcula solo** (figura 6): no hay que hacer cuentas.

FIGURA 21

Obra · Presupuesto y costos

Menú del proyecto → Obra → Presupuesto

El presupuesto se arma por capítulos y partidas; al aprobarlo se convierte en la **línea base de costo**. Aquí se ven también el gasto real y la Curva S. (Proyecto de ejemplo con datos ficticios.)

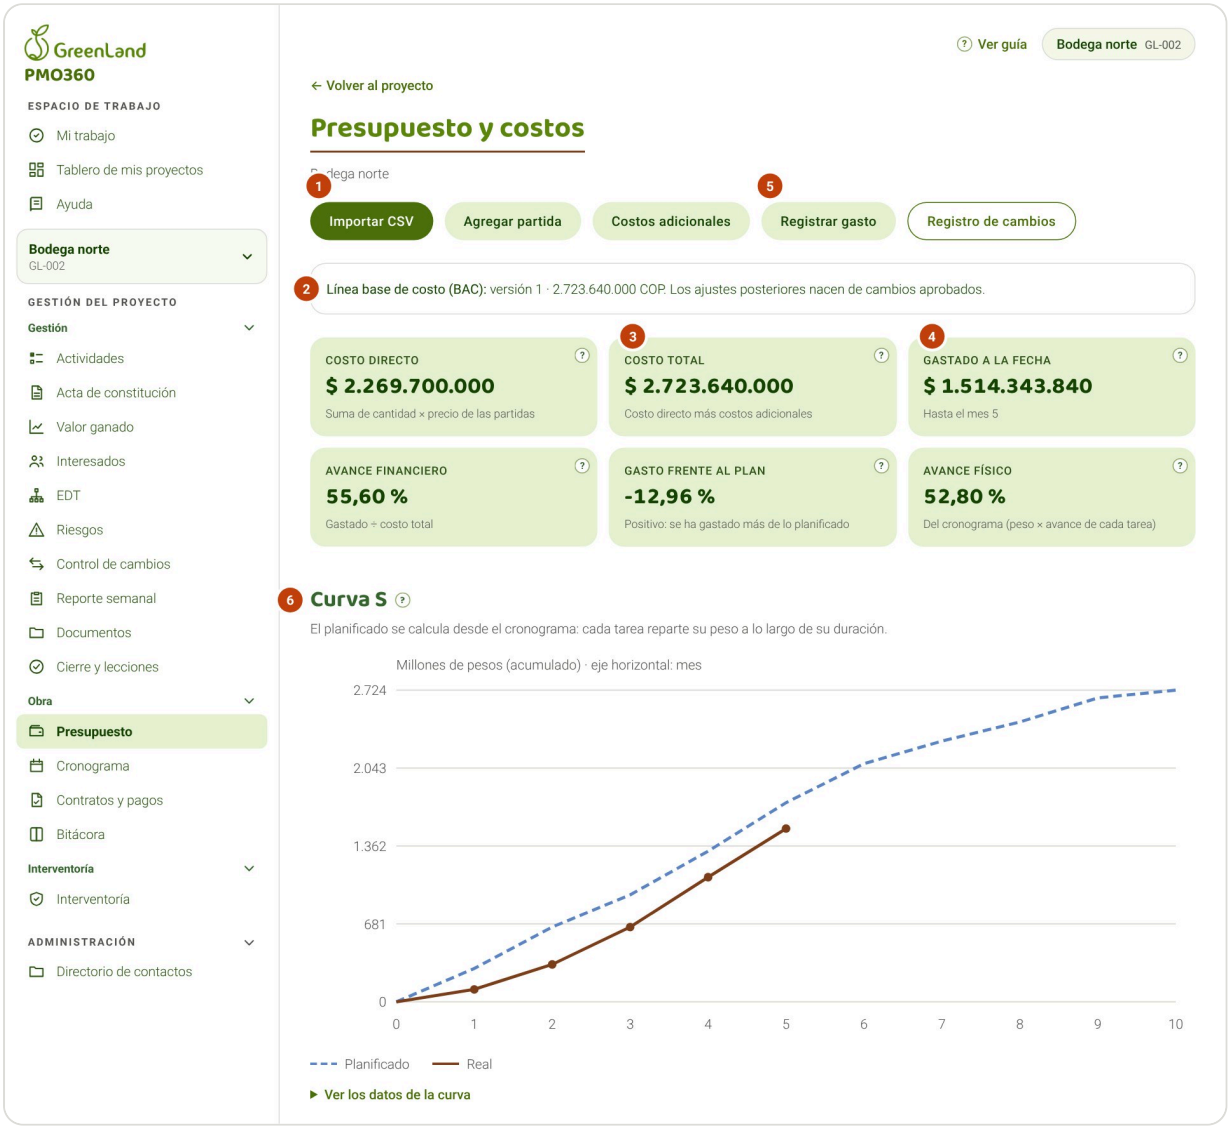

1. **Importar CSV:** carga las partidas desde un archivo (separador punto y coma; la plantilla está en la pantalla). También puedes agregarlas una por una con «Agregar partida».
2. **Línea base de costo (BAC):** el presupuesto aprobado, que sirve de referencia. Después solo cambia con cambios aprobados.
3. **Costo total:** costo directo más costos adicionales (administración, imprevistos, utilidad).
4. **Gastado a la fecha:** gasto real registrado hasta el mes de corte.
5. **Registrar gasto:** se anota el gasto real de cada mes (mes 1 = primer mes del proyecto).
6. **Curva S:** avance acumulado en el tiempo. La línea punteada es lo planificado (sale del cronograma); la continua, lo gastado realmente. Si la continua va por debajo, se ha gastado menos de lo planificado.

Los indicadores de abajo muestran el avance financiero (gastado ÷ costo total) y el avance físico (del cronograma) para compararlos.

FIGURA 22

Obra · Capítulos, partidas y costos adicionales

Presupuesto (más abajo en la misma pantalla)

Más abajo en la pantalla de Presupuesto están el detalle por capítulos y los costos adicionales.



1 Presupuesto por capítulos

Valores en pesos colombianos (COP).

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
1. Preliminares y cimentación (20,62 % del costo directo)					**467.900.000**	
1.01	Localización y replanteo	m2	1.800	4.500	8.100.000	Editar
1.02	Excavación mecánica	m3	2.400	18.500	44.400.000	Editar
1.03	Concreto de cimentación 3000 psi	m3	310	620.000	192.200.000	Editar
1.04	Acero de refuerzo	kg	36.000	6.200	223.200.000	Editar
2. Estructura (27,58 % del costo directo)					**626.000.000**	
2.01	Columnas en concreto 4000 psi	m3	120	780.000	93.600.000	Editar
2.02	Vigas y placa de entrepiso	m3	260	760.000	197.600.000	Editar
2.03	Acero de refuerzo estructura	kg	54.000	6.200	334.800.000	Editar
3. Mampostería y cubierta (27,82 % del costo directo)					**631.400.000**	
3.01	Muros en bloque de concreto	m2	2.600	62.000	161.200.000	Editar
3.02	Estructura metálica de cubierta	kg	28.000	11.500	322.000.000	Editar
3.03	Cubierta en teja termoacústica	m2	1.900	78.000	148.200.000	Editar
4. Instalaciones (10,75 % del costo directo)					**244.000.000**	
4.01	Red hidrosanitaria	gl	1	96.000.000	96.000.000	Editar
4.02	Red eléctrica e iluminación	gl	1	148.000.000	148.000.000	Editar
5. Acabados y exteriores (13,24 % del costo directo)					**300.400.000**	
5.01	Piso industrial en concreto pulido	m2	1.800	58.000	104.400.000	Editar
5.02	Pintura y carpintería metálica	gl	1	84.000.000	84.000.000	Editar
5.03	Obras exteriores y parqueaderos	gl	1	112.000.000	112.000.000	Editar
Costo directo total					**2.269.700.000**	

4 Costos adicionales

Porcentajes definidos por el proyecto (por ejemplo AIU, IVA sobre la utilidad y retefuente).

Concepto	Se calcula sobre	Porcentaje	Valor
Administración	Costo directo	12 %	272.364.000
Imprevistos	Costo directo	3 %	68.091.000
Utilidad	Costo directo	5 %	113.485.000
Total costos adicionales			**453.940.000**
Costo total (directo + adicionales)			**2.723.640.000**

1. **Presupuesto por capítulos:** cada capítulo agrupa partidas y muestra su peso dentro del costo directo.
2. **Capítulo:** la fila verde suma sus partidas (por ejemplo, «Preliminares y cimentación»).
3. **Editar:** corrige cantidad o precio de una partida; los cambios quedan registrados en el «Registro de cambios».
4. **Costos adicionales:** porcentajes definidos por el proyecto (administración, imprevistos, utilidad) sobre el costo directo.
5. **Costo total (directo + adicionales):** es el valor que se aprueba como línea base.


Recomendación: arma primero la EDT y crea los capítulos desde ella; luego agrega las partidas.

FIGURA 23

Obra · Cronograma y Gantt

Menú del proyecto → Obra → Cronograma

Cada tarea tiene semana de inicio, duración y un **peso** (porcentaje de la obra); los pesos deben sumar 100 %. El Gantt se dibuja solo.

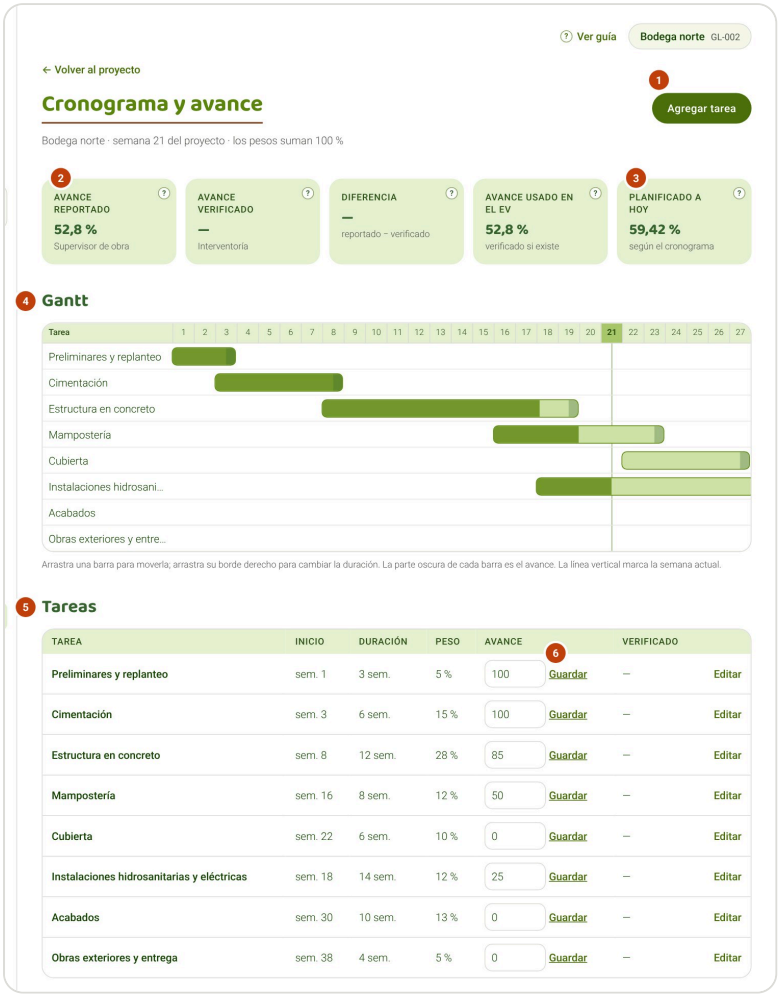

1. **Agregar tarea:** nombre, semana de inicio (1 = primera semana del proyecto), duración y peso.
2. **Avance reportado:** lo que informa el supervisor de obra (suma de peso × avance de cada tarea).
3. **Planificado a hoy:** lo que debería llevar la obra según el cronograma. Compáralo con el avance reportado: si es menor, hay atraso.
4. **Gantt:** la parte oscura de cada barra es el avance; la línea vertical marca la semana actual. Puedes arrastrar una barra para moverla o su borde derecho para cambiar la duración.
5. **Tareas:** la lista con inicio, duración, peso y avance.
6. **Avance y Guardar:** escribe el avance de la tarea (0 a 100 %) y pulsa Guardar.


La interventoría registra el «avance verificado»; si existe, es el que usa el valor ganado.

FIGURA 24

Obra · Contratos y pagos

Menú del proyecto → Obra → Contratos y pagos

Lista de contratos del proyecto con su ejecución. La plataforma registra y calcula; **no ejecuta pagos**.

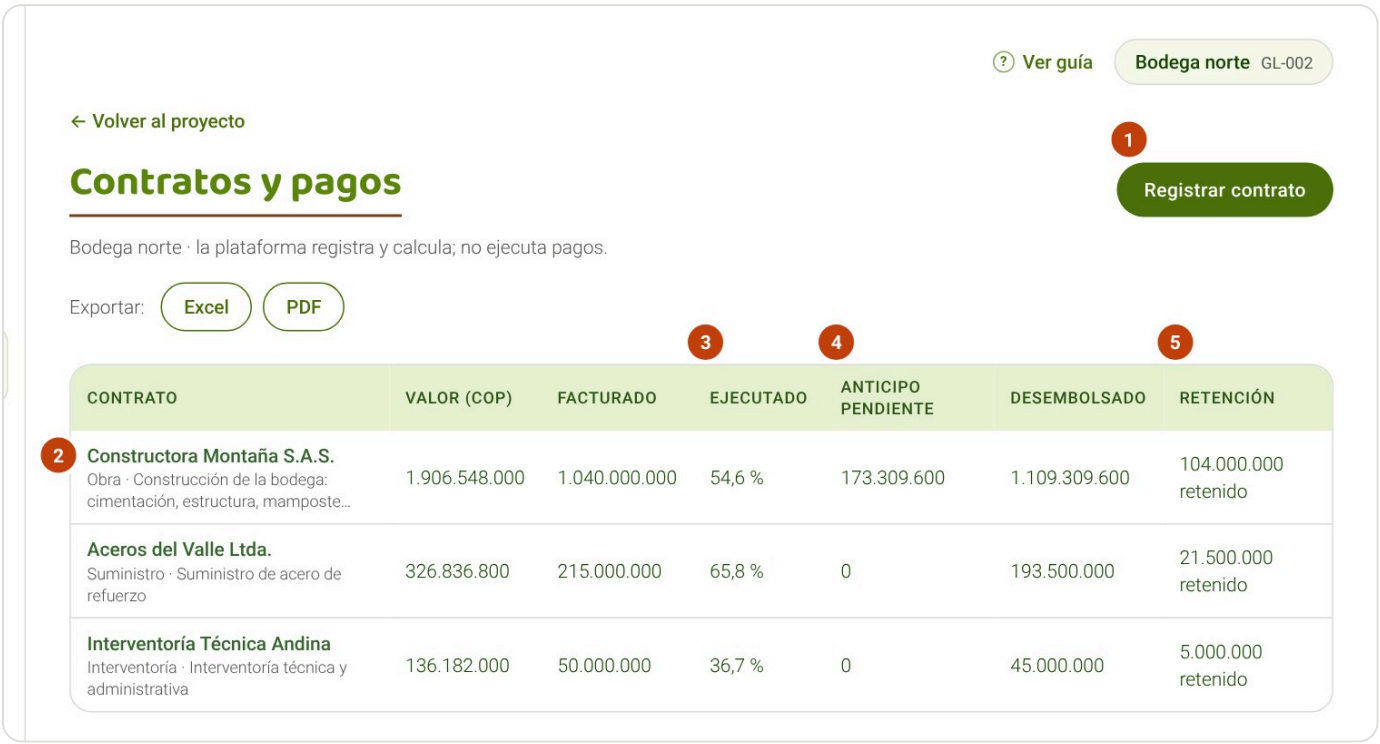

1. **Registrar contrato:** contratista, tipo (obra, suministro, interventoría…), objeto y valor.
2. **Un contrato por fila:** haz clic para ver su detalle (figura siguiente).
3. **Ejecutado:** porcentaje del valor del contrato ya facturado.
4. **Anticipo pendiente:** la parte del anticipo que falta por amortizar.
5. **Retención:** lo retenido como garantía hasta la liberación.


Arriba están los botones Excel y PDF para exportar la lista.

FIGURA 25

Obra · Detalle del contrato y evolución de pagos

Contratos y pagos → clic en un contrato

Aquí se sigue el contrato y su evolución de pagos acta por acta.

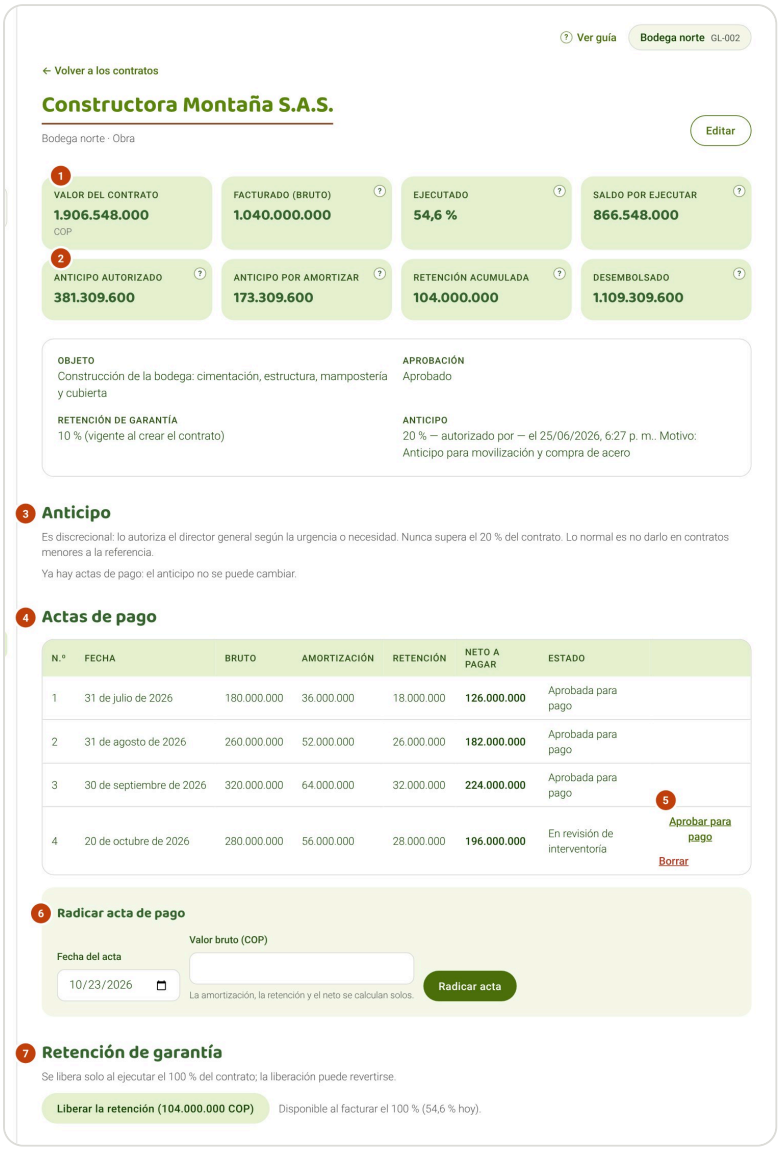


1. **Valor del contrato, facturado, ejecutado y saldo por ejecutar.**
2. **Anticipo autorizado:** lo autoriza el director general, nunca supera el 20 % del contrato; se amortiza en cada acta.
3. **Anticipo:** reglas del anticipo; cuando ya hay actas de pago no se puede cambiar.
4. **Actas de pago:** cada acta muestra bruto, amortización del anticipo, retención y **neto a pagar**, con su estado (radicada, en revisión de interventoría, con observaciones o aprobada para pago).
5. **Aprobar para pago:** pasa el acta a «aprobada para pago» (según tu rol).
6. **Radicar acta de pago:** escribe la fecha y el valor bruto; la amortización, la retención y el neto se calculan solos.
7. **Retención de garantía:** se libera solo al ejecutar el 100 % del contrato.

FIGURA 26

Obra · Bitácora: listado

Menú del proyecto → Obra → Bitácora

Registro diario de la obra, una entrada por día. (Entradas de ejemplo.)

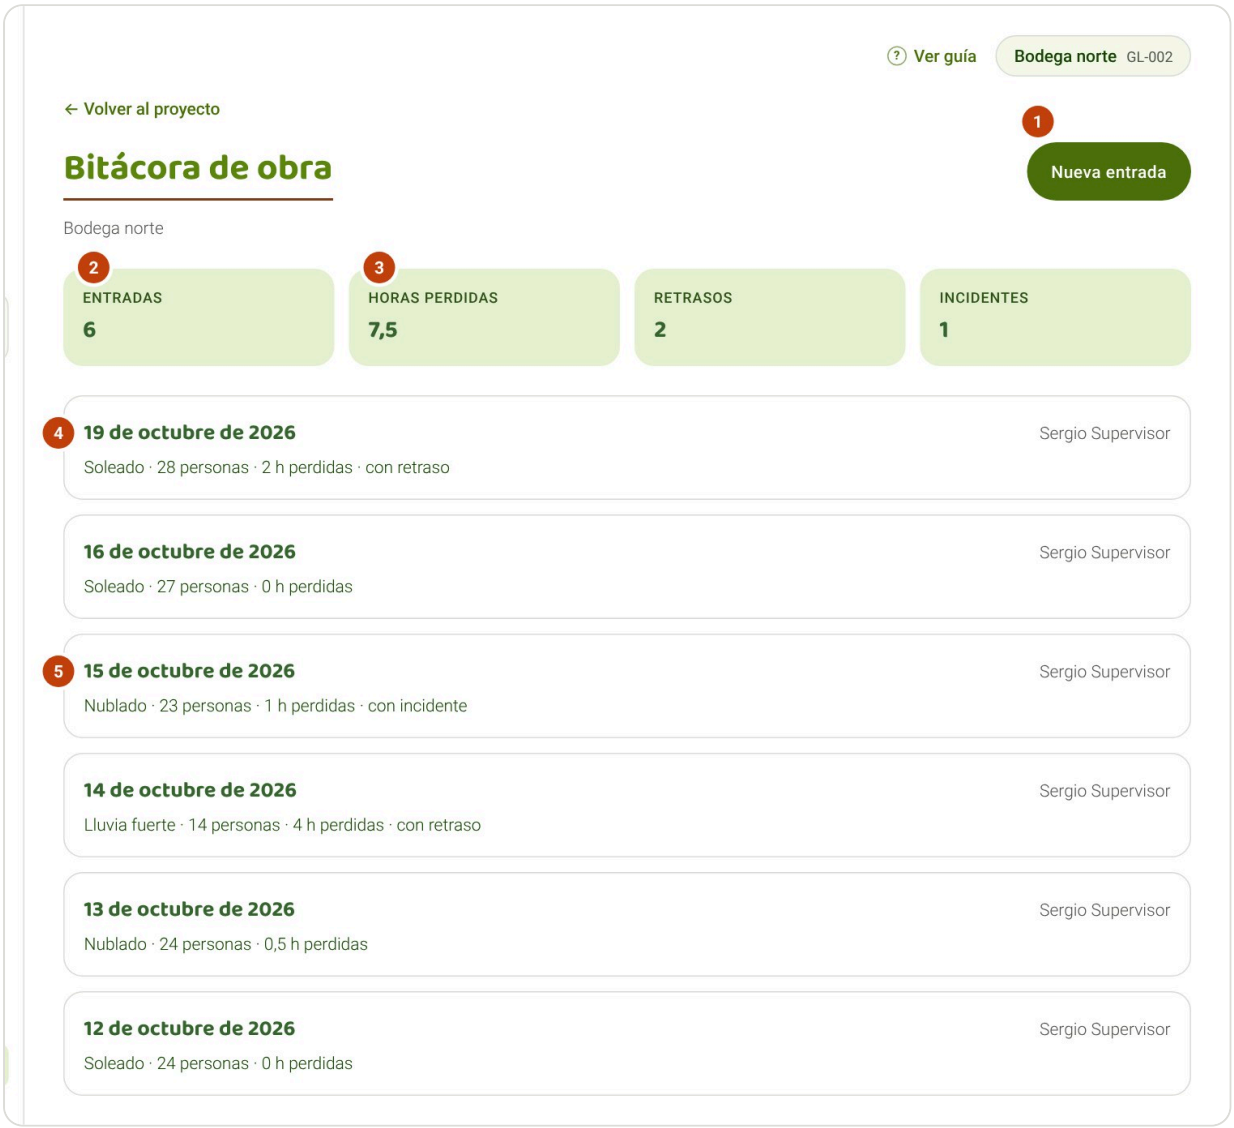


1. **Nueva entrada:** abre el formulario del día (figura 28).
2. **Entradas:** cuántos días están registrados.
3. **Horas perdidas:** suma de horas perdidas por clima y por retrasos.
4. **Cada día:** clima, personal, horas perdidas y marcas «con retraso» o «con incidente». Haz clic para abrirlo.
5. **Día con incidente:** aquí, un casi accidente de seguridad registrado.

FIGURA 27

Obra · Bitácora: una entrada

Bitácora → clic en un día

El detalle de una entrada guardada.

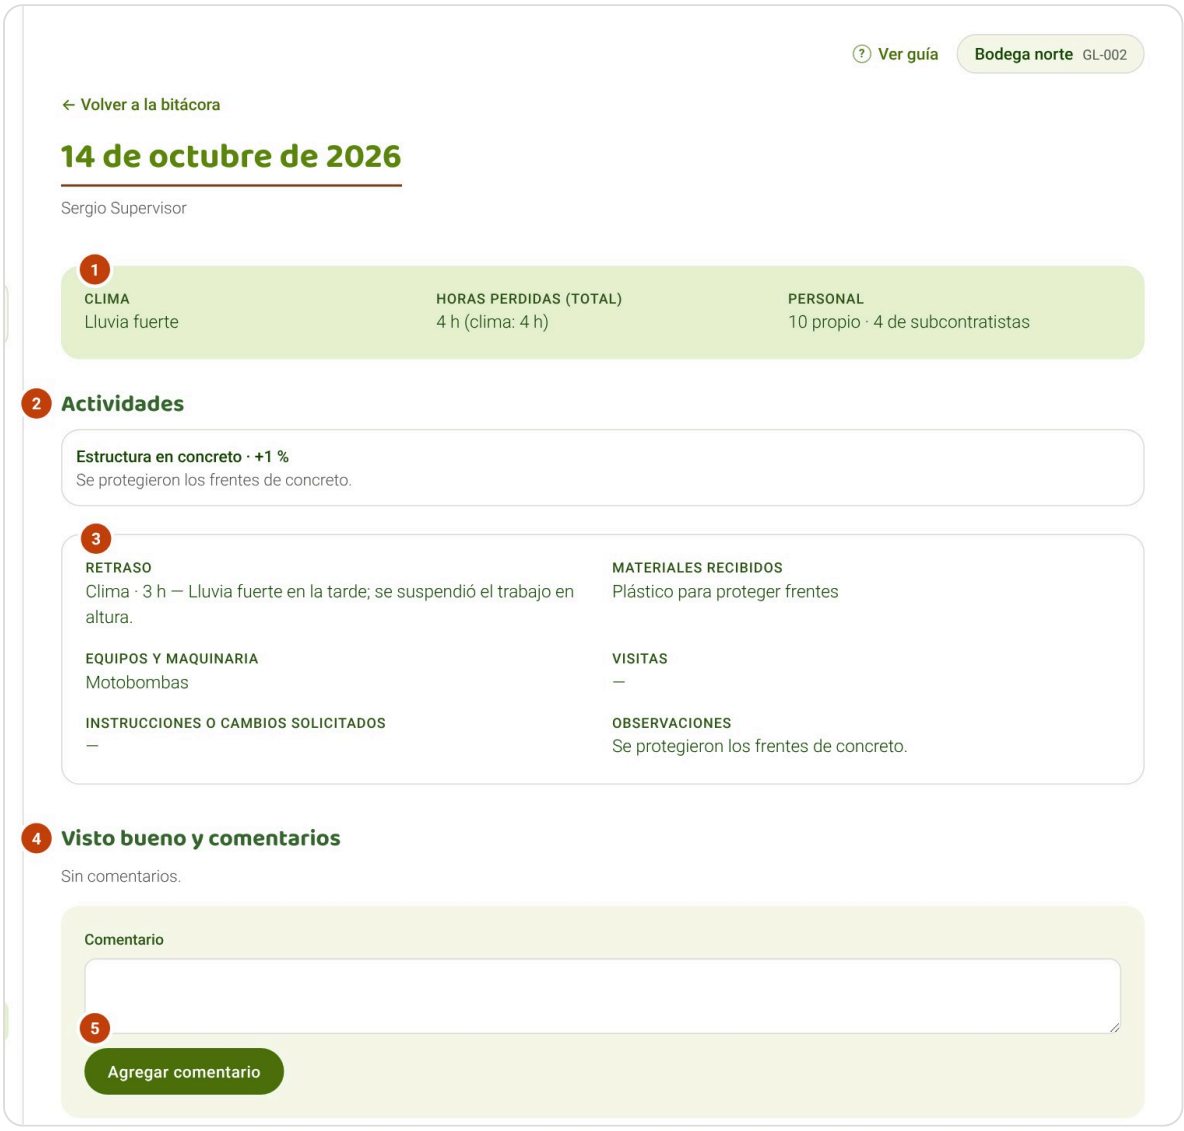


1. **Clima, horas perdidas y personal** del día.
2. **Actividades:** lo que se hizo, con el avance que sumó a la tarea del cronograma (+1 %).
3. **Retraso, materiales, equipos, visitas, instrucciones y observaciones.**
4. **Visto bueno y comentarios:** el equipo y la interventoría pueden comentar la entrada.
5. **Agregar comentario:** es la forma de corregir o aclarar, porque una entrada guardada no se edita.

FIGURA 28

Obra · Bitácora: llenar una entrada nueva

Bitácora → Nueva entrada

Formulario de ejemplo diligenciado (todavía sin guardar).

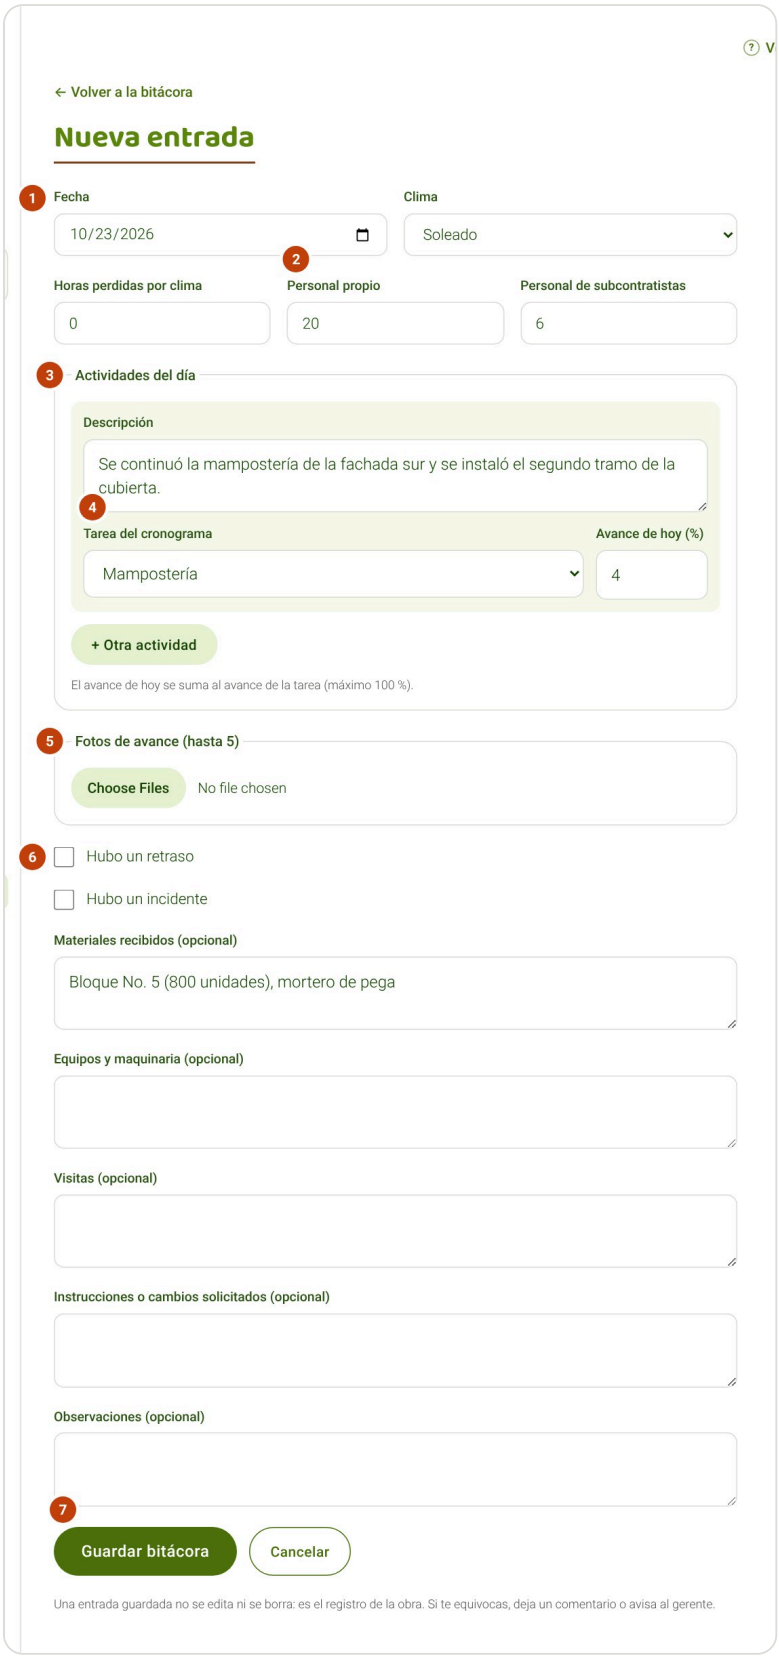

1. **Fecha:** la de hoy por defecto; no puede ser futura.
2. **Clima, horas perdidas y personal** propio y de subcontratistas.
3. **Actividades del día:** describe lo que se hizo; con «+ Otra actividad» agregas más.
4. **Tarea del cronograma y avance de hoy:** el avance se suma al de la tarea (máximo 100 %); así la bitácora alimenta el cronograma.
5. **Fotos de avance:** hasta 5.
6. **Hubo un retraso / un incidente:** al marcarlos aparecen los campos para causa, horas y descripción.
7. **Guardar bitácora:** una entrada guardada no se edita ni se borra; si te equivocas, deja un comentario o avisa al gerente.


En el celular el formulario funciona igual y permite tomar las fotos directamente.

FIGURA 29

En el celular

Cualquier pantalla

La plataforma se adapta a la pantalla del celular.

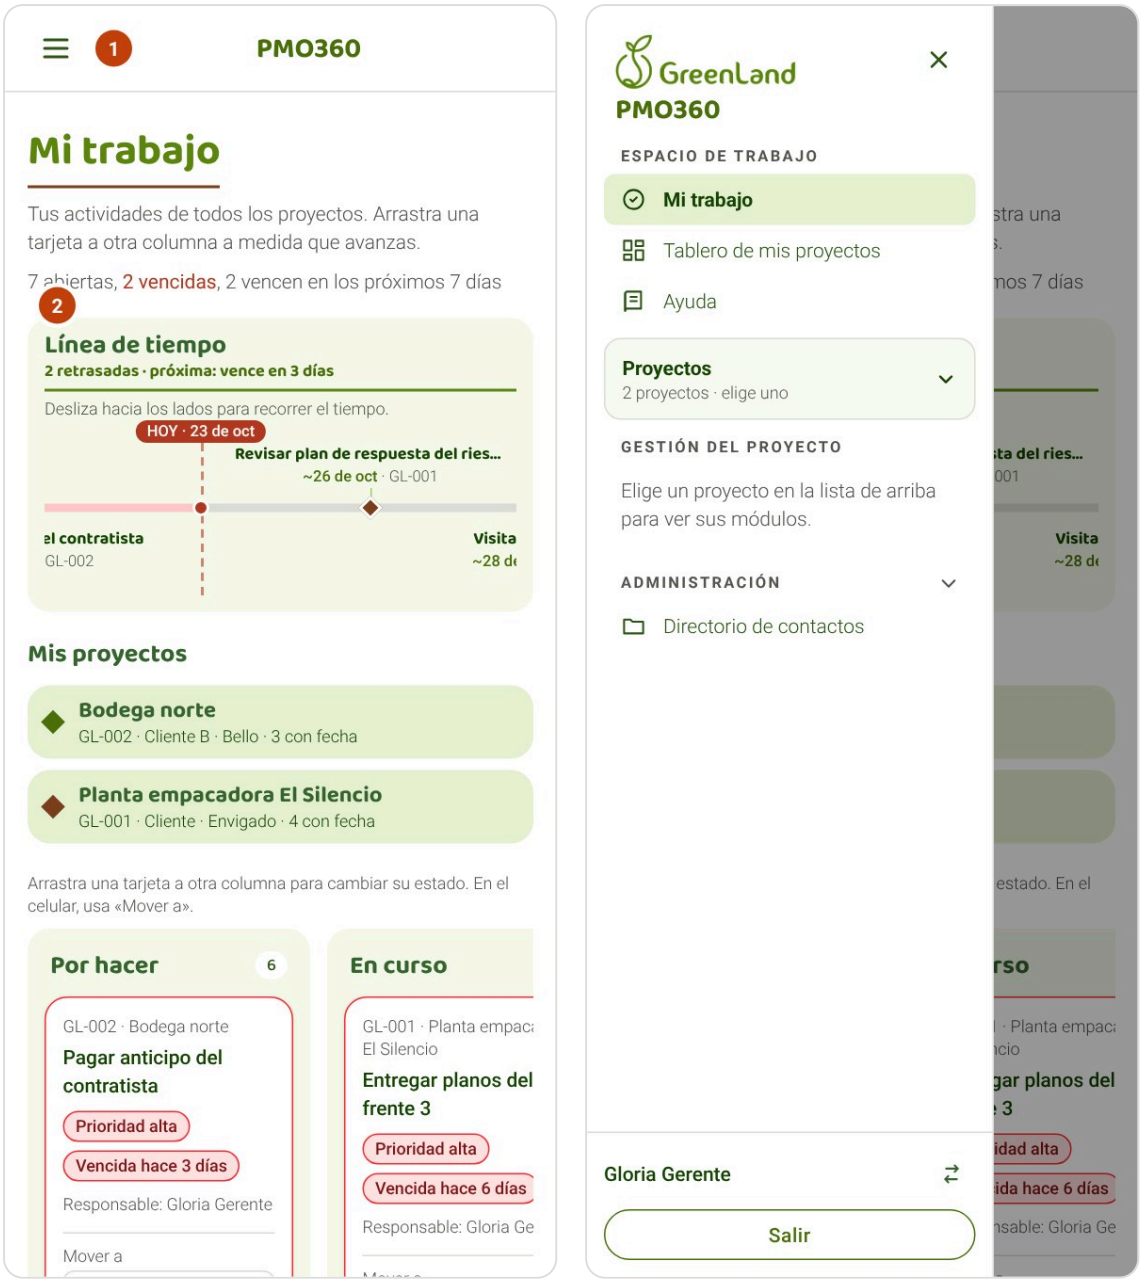

1. **Botón ☰** (izquierda): abre el menú de navegación. Se cierra con la X.
2. **Línea de tiempo** (izquierda): desliza hacia los lados para recorrer el tiempo.
3. **Menú abierto** (derecha): las mismas zonas que en la computadora: Espacio de trabajo, Proyectos, Gestión del proyecto y Administración.

Para mover una actividad en el celular, usa el selector «Mover a».
