
Mapa de proceso PMO360

Nov. 2026 · Borrador para revisión
Los datos de la plataforma son ficticios hasta el piloto

Ciclo de vida del proyecto, paquetes de trabajo, módulos, roles y puntos de decisión · Control integral de Proyectos · GreenLand · Versión resumida · Mapa de metro

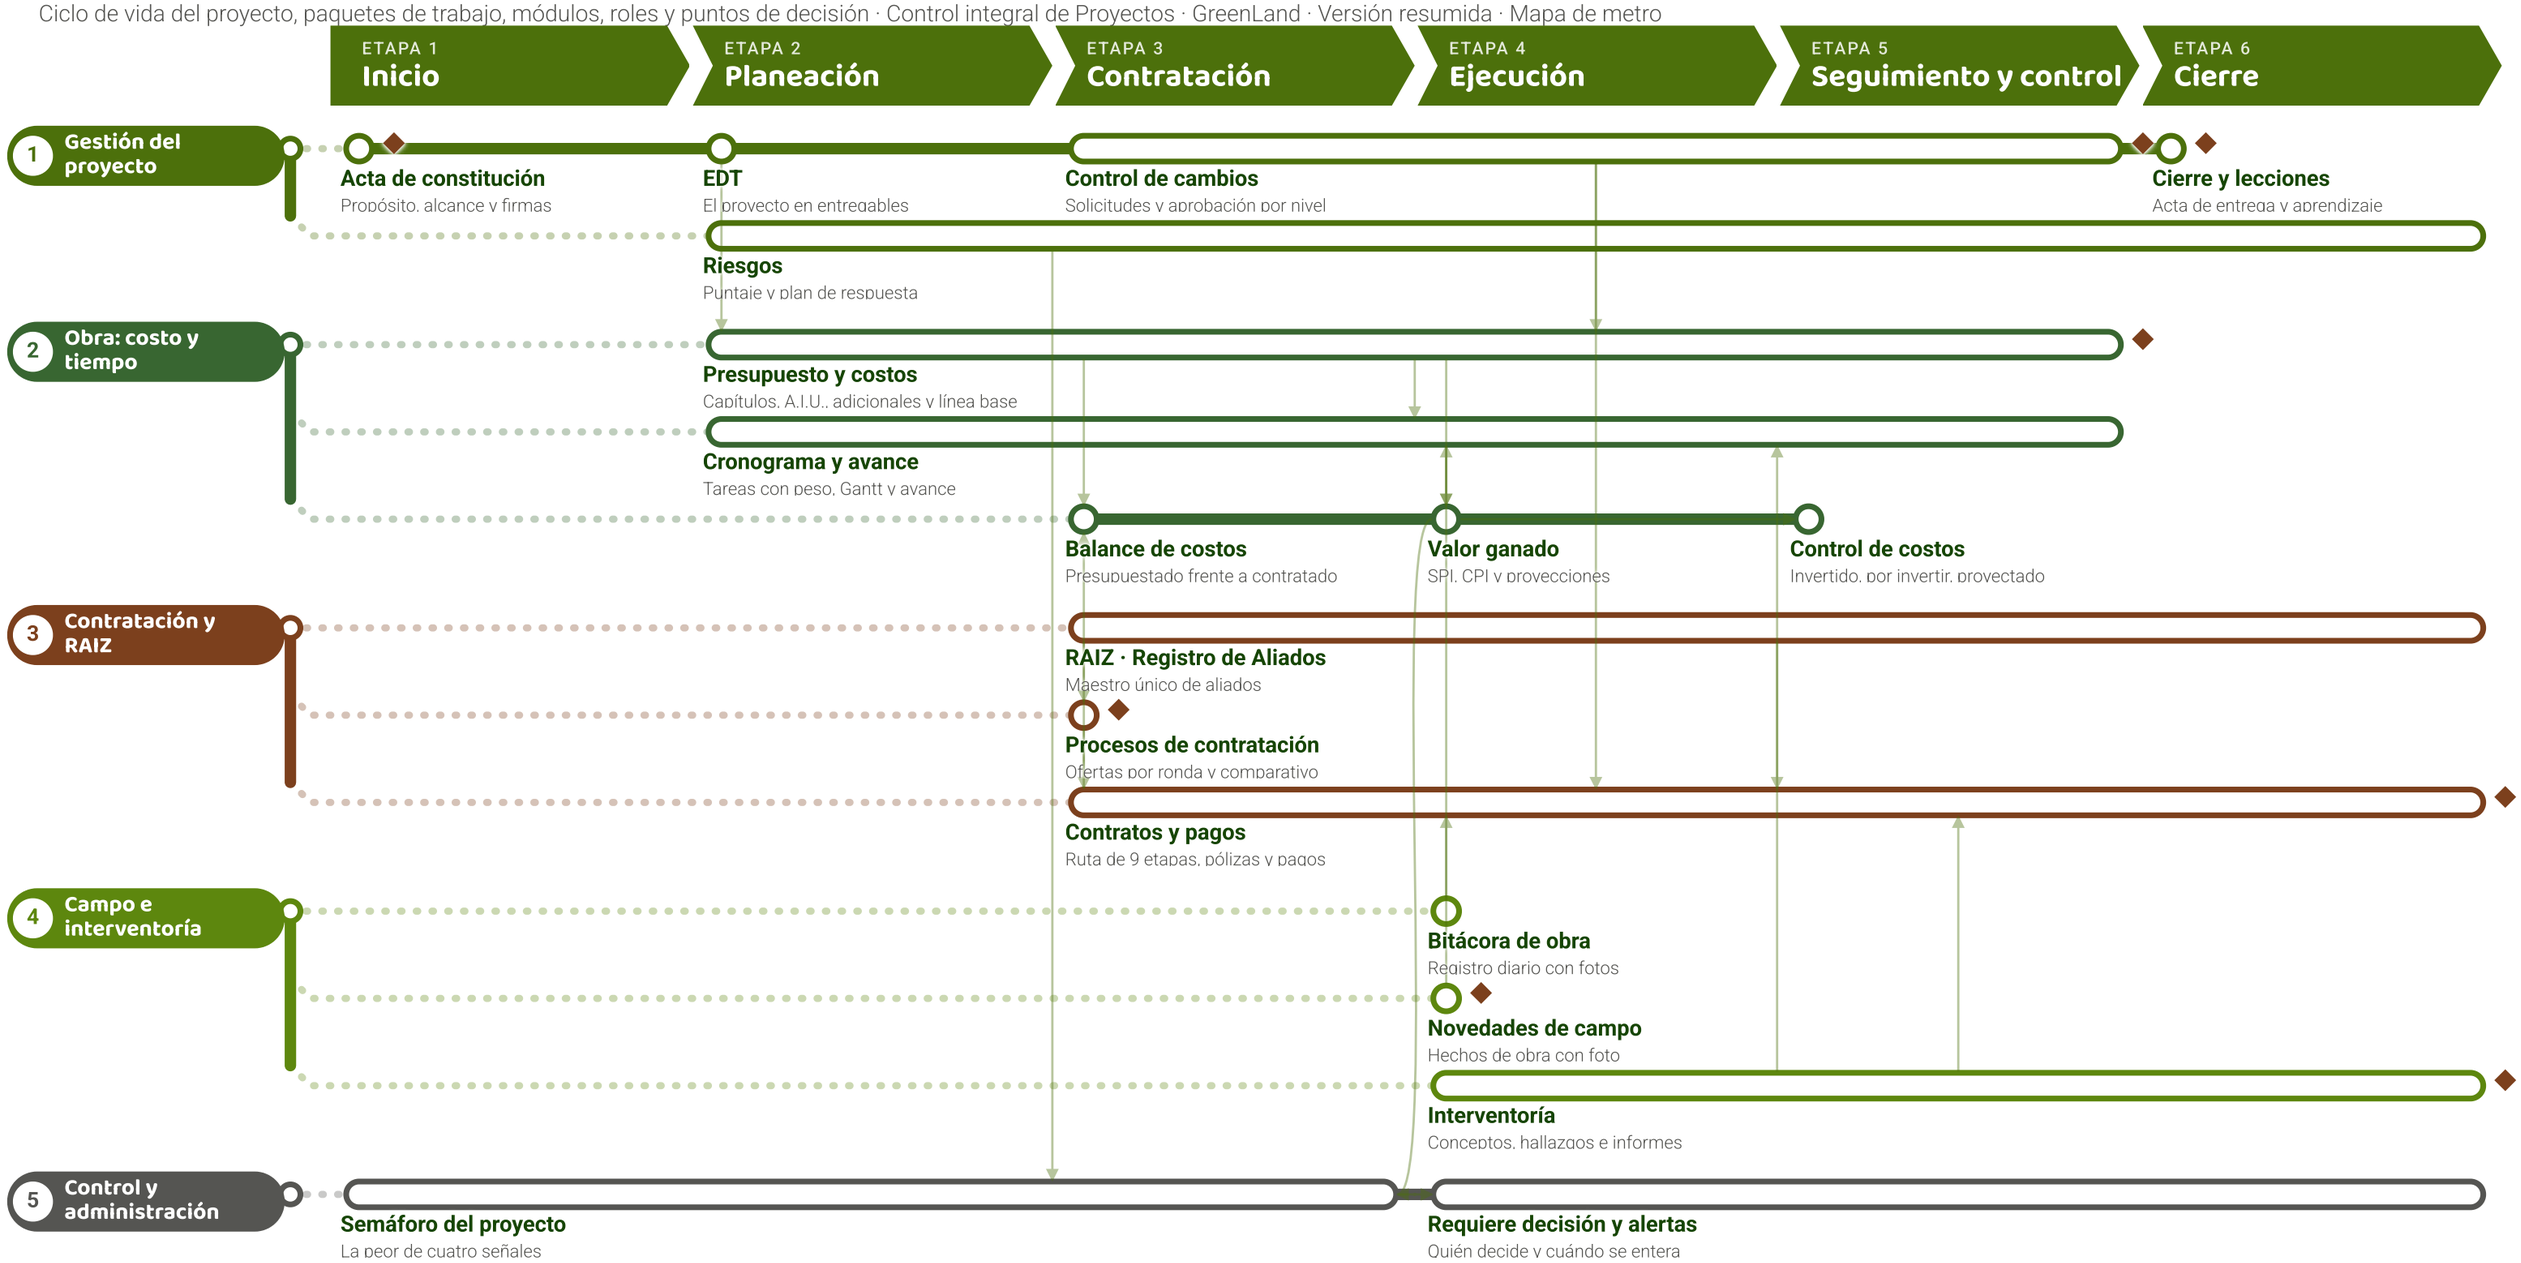

Quién puede qué

Administrador (AD)
Todo: usuarios, parámetros y estructura

Director general (DI)
Aprueba contratos, anticipos y cambios moderados y críticos

Analista PMO (AN)
Consolida, evalúa cambios y mantiene los tableros

Gerente de proyecto (GE)
Gestiona su proyecto; aprueba cambios menores y adjudica

Patrocinador (PA)
Firma el acta y los cambios de más de 5 %

Finanzas (FI)
Ve presupuesto, contratos y pagos

Supervisor de obra (SU)
Registra bitácora, fotos y avance de obra

Interventoría (IN)
Conceptúa y verifica; no aprueba

Consulta (CO)
Solo lectura

Puntos de decisión ◆

- ◆ **Acta de constitución** · GE · PA: Firman el gerente y el patrocinador
- ◆ **Presupuesto y costos** · GE: Aprueba la línea base de costo
- ◆ **Control de cambios** · GE · DI · PA: Menor: gerente. Moderado y crítico: director general. Más de 5 % del presupuesto: también el patrocinador
- ◆ **Procesos de contratación** · GE: Adjudica la oferta ganadora (habilitada y con valor)
- ◆ **Contratos y pagos** · DI: Aprueba los contratos nuevos
- ◆ **Contratos y pagos** · DI: Autoriza el anticipo (máximo 20 %, con su motivo)
- ◆ **Novedades de campo** · GE · AD: Aplica o descarta cada novedad (descartar exige motivo)
- ◆ **Interventoría** · AD · DI: Asigna la interventoría a cada contrato
- ◆ **Cierre y lecciones** · GE · AD: Cierra el proyecto; los cambios sin resolver lo bloquean. Solo el administrador lo reabre

Cómo leerlo

- ◆ Punto de decisión
- AD Decide o aprueba
- AD Registra o trabaja
- → El dato pasa de un módulo a otro
